

SO 180

Přechodné dopravní značení

Objednatel:

**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC****Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:

**Valbek, spol. s r.o.**Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

HIP

ING. T. KLIMENT

	Vypracoval	STANISLAV KRUPÍČKA		Zak. číslo	024-24
	Zodp. projektant	ING. PETER HAJOŠ		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ANTONÍN SEIDL		Stupeň	PDPS
	Akce			Paré	
I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE					
Zhotovitel: DISK s.r.o. Menšíkovská 1239/10 160 00 Praha 6					

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 180 – Přejídné dopravní značení

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY	3
c) OBECNÝ POPIS SO	3
d) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	3
e) POPIS DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ	5
f) ZÁVĚR	6

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět projektové dokumentace	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Kosmonosy [669857] Plazy [721590] Židněves [796786] Březno u Mladé Boleslavi [614467] Sukorady u Mladé Boleslavi [759350] Obrubce [708798]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s.p. Čerčanská 2023/12 Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek spol. s r.o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230
Zpracovatel SO:	DISK s.r.o. Menšíkovská 1239, 160 00 Praha 6
IČO:	61065579

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Název:	dočasný objekt – stavba
--------	-------------------------

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 180 – Přechodné dopravní značení

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

Na začátku úseku je trasa silnice č. I/16 napojena do MÚK Kosmonosy (související stavba), na konci úseku je stavba napojena na stávající komunikaci u obce Martinovice. Dále je silnice I/16 na stávající silniční síť napojena dvěma mimoúrovňovými křižovatkami – MÚK Židněves (SO 111) a MÚK Martinovice (SO 112). Celková délka trasy je 8,200 km. Komunikace je navržena v návrhové kategorii S 13,5/90.

Návrhová kategorie	S 13,5/90
Kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb.	silnice
Dopravní význam	silnice I. třídy
Charakter provozu	silnice s neomezeným přístupem

c) OBECNÝ POPIS SO

Předmětem zpracování této části projektové dokumentace je návrh dopravních opatření pro realizaci stavby silnice č. I/16.

Dopravní opatření jsou v tomto stupni dokumentace řešena pouze schematicky a musí být dopracována v realizační dokumentaci podle postupu výstavby konkrétního dodavatele. Tato dokumentace neslouží pro realizaci stavby. Na zpracovaný projekt musí navazovat realizační dokumentace stavby (RDS).

Stavba se napojuje a kříží silnice I., II. a III. tříd, místní komunikace a polní cesty. Při výstavě budou na těchto komunikacích nutná dopravní opatření, která zajistí prostor pro realizaci stavby.

Součástí jsou taktéž dopravní opatření pro realizaci vodohospodářských objektů. Tato opatření budou řešena na etapy dle odsouhlaseného postupu prací následného správce.

d) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Dopravně inženýrská opatření jsou zpracována dle Příruček pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích vydaných ŘSD, dle požadavků ŘSD (tj. R-plánů, standardům PPK), ZTKP kap. 14, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, souvisejících technických norem a technických podmínek Ministerstva dopravy. Návrh DIO je zpracován dle aktuální verze PS11.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 180 – Přechodné dopravní značení

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

Kvalitativní provedení

Veškeré dopravní značení (svislé i vodorovné) musí být provedeno v souladu se zákonem 361/2000 Sb., s vyhláškou č. 294/2015 Sb., příslušnými normami, vzorovými listy, technickými podmínkami a vnitropodnikovými předpisy ŘSD (zejména PPK-PRE, PPK-VOZ, PPK-SVE a R-plány), které jsou dostupné na webu ŘSD v sekci Technické předpisy > PPK a dopravní značení.

Činná plocha přenosných dopravních značek musí být v souladu s ČSN a TP 66.

Přenosné dopravní značky budou celolisované z hliníkových nebo ocelových pozinkovaných plechů s dvojitým ohybem po celém obvodu, včetně rohů.

Uchycení přenosných dopravních značek na nosnou konstrukci musí být provedeno pomocí speciální příchytky zabraňující jejímu pootočení či uvolnění, pevně spojené se zadní stěnou značky.

Značky budou připevněny na nosné konstrukce (sloupky) z AL nebo FeZn profilu o průřezu 40 x 40 mm (tzv. jáckl) s červenobílým reflexním polepem a osazené do přenosných podstavců z recyklovaných materiálů nebo u značek o rozměru 1 x 1,5 m do speciálních konstrukcí (podstavců).

Přenosné dopravní značky se umísťují co nejbližší k pravému, resp. k levému okraji vozovky ve směru jízdy vozidla. Značky ani jejich nosné konstrukce však nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace.

Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo otočením tak, aby DZ nebyly viditelné z žádného jízdního směru.

S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních značek a dopravních zařízení. Značky musí být odpovídajícím způsobem aktualizovány v souladu s postupem prací a stavem stávajícího dopravního značení v době realizace.

Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny. Funkčnost a stav přechodného dopravního značení musí být pravidelně kontrolován. Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být ihned nahrazeny. Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu s projektem. Pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení. Za správné provádění odpovídá zhotovitel přechodného dopravního značení.

Přechodné vodorovné dopravní značení bude provedeno z fólie s textilní mřížkou nebo barvou s ohledem především na klimatické podmínky v době realizace, dobu trvání daného dopravního opatření a na to, zda se jedná o VZD na úseku s novým nebo již starším povrchem. V případě použití barvy bude k jejímu odstranění použito tlakové tryskání vodou. Zhotovitel zajistí, že při případném užití barvy na přechodné vodorovné dopravní značení, bude toto značení po celou dobu trvání uzavírky svými parametry odpovídat TP 70 a PPK-PRE.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 180 – Přejížděcí dopravní značení

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

e) POPIS DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ

Postup výstavby je rozdělený do 3 základních etap. Z hlediska dopravních opatření je stavba rozdělena do 3 etap a dalších podetap.

Etapu 1

V 1. etapě bude provedena příprava území, skrytka ornice, sanační opatření na hlavní trase (SO 101), výstavba přeložky SO 101 v km 0,000 – km cca 7,500, výstavba MÚK SO 111 a SO 112, výstavba prvků odvodnění, výstavba přeložek vodních toků, výstavba jednotlivých přeložek SO 121, SO 122, SO 123, část SO 124, část SO 126, část SO 127, výstavba přístupových komunikací SO 150, SO 154, výstavba mostních objektů SO 201 – SO 206, SO 221 – SO 223.

V 1. etapě bude po dobu výstavby SO 121 uzavřena silnice č. III/2768 mezi obcemi Plazy a Valy. Objízdná trasa bude vedena po silnici č. I/16 do Sukorad, následně po III/27612 do Husí Lhoty a dále směr Valy. Tato etapa je v dokumentaci označena jako etapa 1a.

Po dobu výstavby SO 122 bude uzavřena silnice č. III/27612 mezi obcemi Sukorady a Husí Lhoty. Objízdná trasa bude vedena po silnici č. I/16 do obce Plazy, z Plazů po silnici č. III/2768 do Valů a dále do Husí Lhoty. Tato etapa je označena jako 1b. Výstavba SO 121 a 122 nemůže být prováděna současně.

U obce Martinovice bude provizorně zúžena přístupová komunikace k servisu Auto Zítka a k čerpací stanici. Tato komunikace bude dočasně jednosměrná a výjezd bude na silnici č. I/16 až za obcí Martinovice – etapa 1a. V této etapě bude provedeno rozšíření stávající komunikace.

Následně bude uzavřeno napojení od čerpací stanice na silnici č. I/16 a bude vybudována provizorní komunikace SO 171. Výjezd z čerpací stanice bude po rozšířené stávající komunikaci okolo napojení Auto Zítka na I/16 – etapa 1b.

Etapu 2

Ve 2. etapě bude provedena výstavba SO 101 v km 7,5 – 7,9, SO 153.3, SO 207 a SO 329.

U obce Martinovice bude provoz ze stávající silnice č. I/16 převeden obousměrně na nově vybudovanou provizorní komunikaci SO 171 a bude veden po rozšířené stávající komunikaci podél čerpací stanice a servisu Auto Zítka zpět na silnici č. I/16. Dopravní obsluha obce Martinovice bude z obce Sukorady po místních komunikacích.

Před ukončením 2. etapy výstavby bude provedeno napojení větví okružních křižovatek v prostoru MUK Martinovice a MUK Židněves na stávající silnici č. I/16. Provoz na stávající silnici č. I/16 bude v místech napojení ve dvou zúžených provizorních jízdních pruzích. Napojení musí být provedeno tak, aby bylo následně možné vedení provozu po těchto větvích alespoň v jednom jízdním pruhu.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 180 – Přechodné dopravní značení

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

Etapu 3

Ve 3. etapě bude zprovozněna nová přeložka sinice č. I/16 a budou provedené dokončovací práce a napojení na stávající komunikace. Jedná se především o dostavbu SO 101 v km 7,9 – 8,2, dostavbu SO 125, 126 a 127.

Při dostavbě SO 101 na konci úseku v km 7,9 – 8,2 bude doprava vedena na silnici č. I/16 nejprve ve dvou provizorních zúžených jízdních pruzích při pravém a následně levém okraji komunikace – etapa 3a a 3b. Tyto etapy budou využity pro rozšíření zemního tělesa. Následně pak bude provoz řízen kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení – etapy 3c1 a 3c2. V těchto etapách bude provedena pokládka živičných vrstev. Doba trvání etap s kyvadlovým řízením dopravy bude co možná nejkratší.

Taktéž napojení větví okružních křižovatek v MUK Martinovice a MUK Židněves na původní I/16 bude provedeno po polovinách při kyvadlovém řízení provozu světelnými signály – etapy 3a a 3b. Doba trvání těchto opatření musí být taktéž minimální.

Bude provedeno napojení výjezdů z DUN v km cca 5,0 na původní silnici č. I/16. Na původní silnici č. I/16 bude v místech napojení doprava vedena ve dvou provizorních zúžených jízdních pruzích.

Polní cesty

Polní cesty křižující novou stavbu budou po dobu provádění prací uzavřeny.

Ostatní dopravní opatření

Po dobu výstavby bude nutné zřízení vjezdů na staveniště a při kontaktu se stávajícími komunikacemi budou nutná i další dopravní opatření. Tato opatření budou realizována podle postupu výstavby a potřeb konkrétního dodavatele. Budou taktéž realizována dopravní opatření pro realizaci vodohospodářských objektů. Jejich etapizace bude řešena podle odsouhlaseného postupu prací následného správce.

Úprava dopravního značení v prostoru MÚK Kosmonosy

Při zprovoznění stavby bude nutné provést úpravu definitivního dopravního značení v prostoru MUK Kosmonosy. Součástí SO 180 je taktéž provedení veškerých dopravních opatření pro provedení této úpravy definitivního dopravního značení. Rozsah úprav je zřejmý z SO 190.

f) ZÁVĚR

Před realizací je nutné dopracovat dokumentaci dopravně inženýrských opatření a zajistit jejich projednání, např. rozhodnutí o uzavírcce a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, u příslušných silničních správních úřadů.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 180 – Přejíchné dopravní značení

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)


Technická zpráva

Tuto dokumentaci nelze použít jako dokumentaci RDS!!!


Zhotovitel zajistí projednání dopravních opatření a vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a stanovení přejíchné úpravy provozu na pozemní komunikaci příslušným silničním správním úřadem.

Tuto dokumentaci nelze použít jako dokumentaci RDS!!!

ETAPA 1 - UZAVŘENÍ SILNICE III/2768 A UZAVŘENÍ SILNICE III/27612

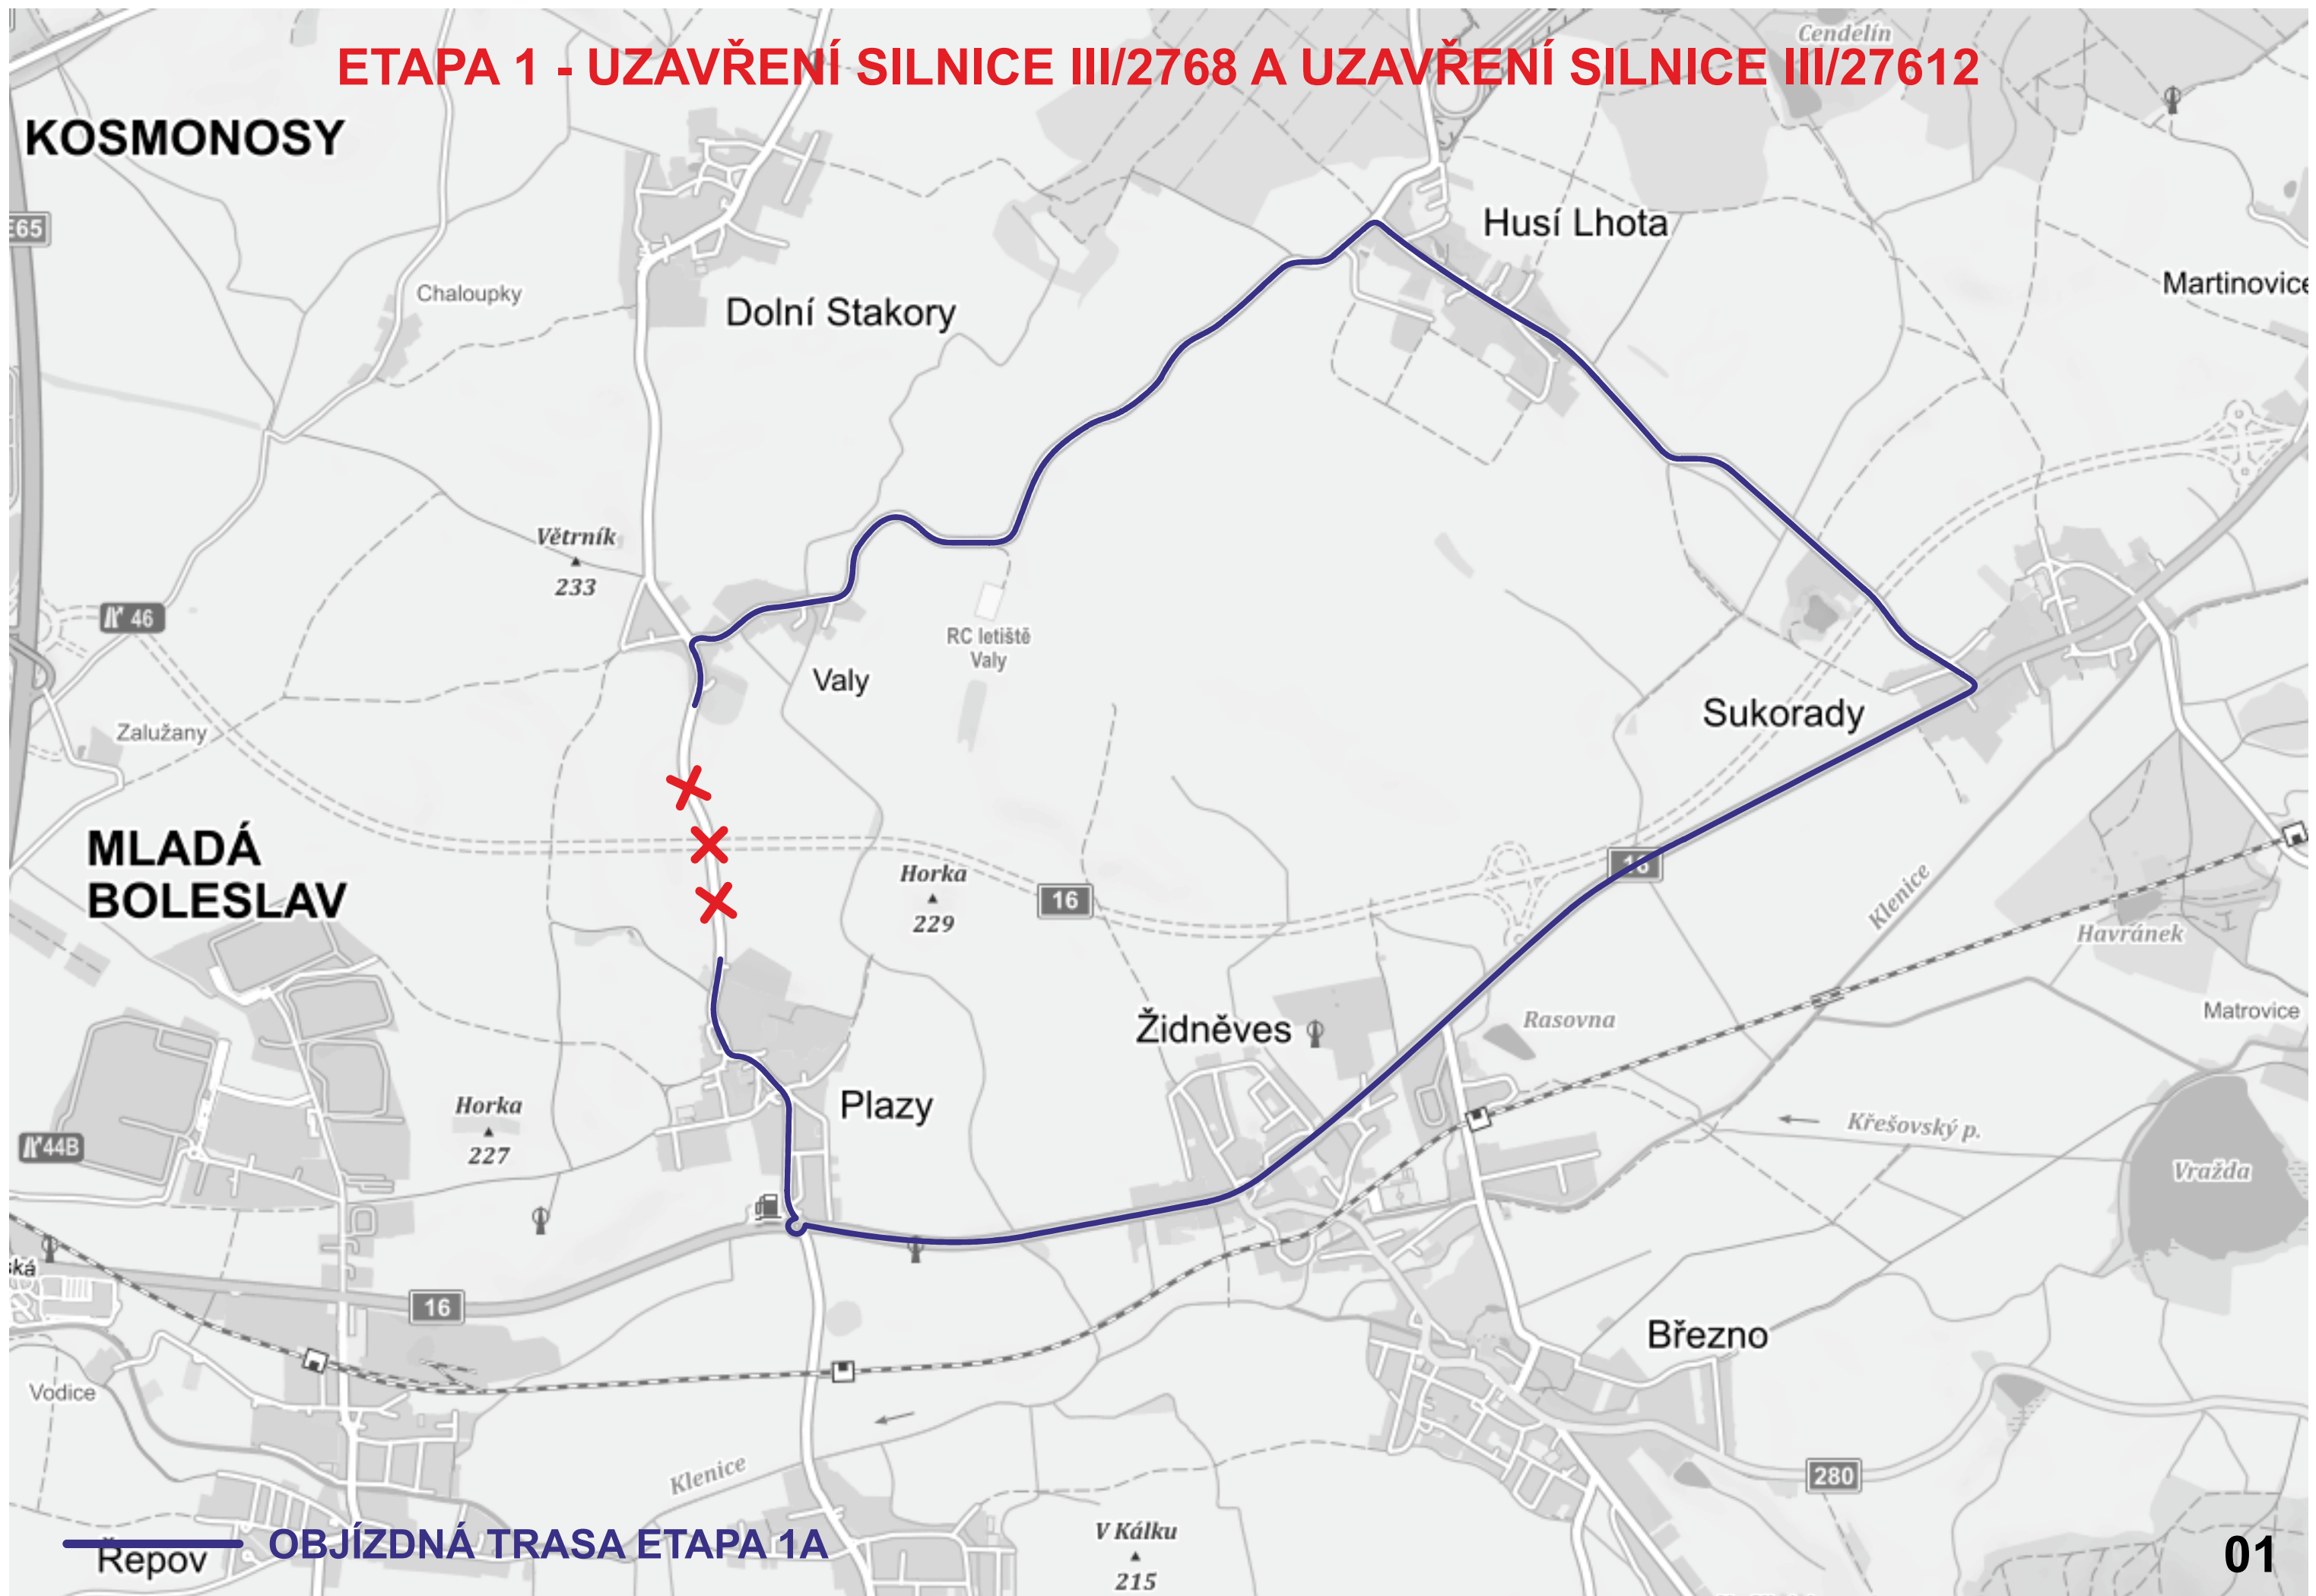


ETAPA 1 - UZAVŘENÍ SILNICE III/2768 A UZAVŘENÍ SILNICE III/27612

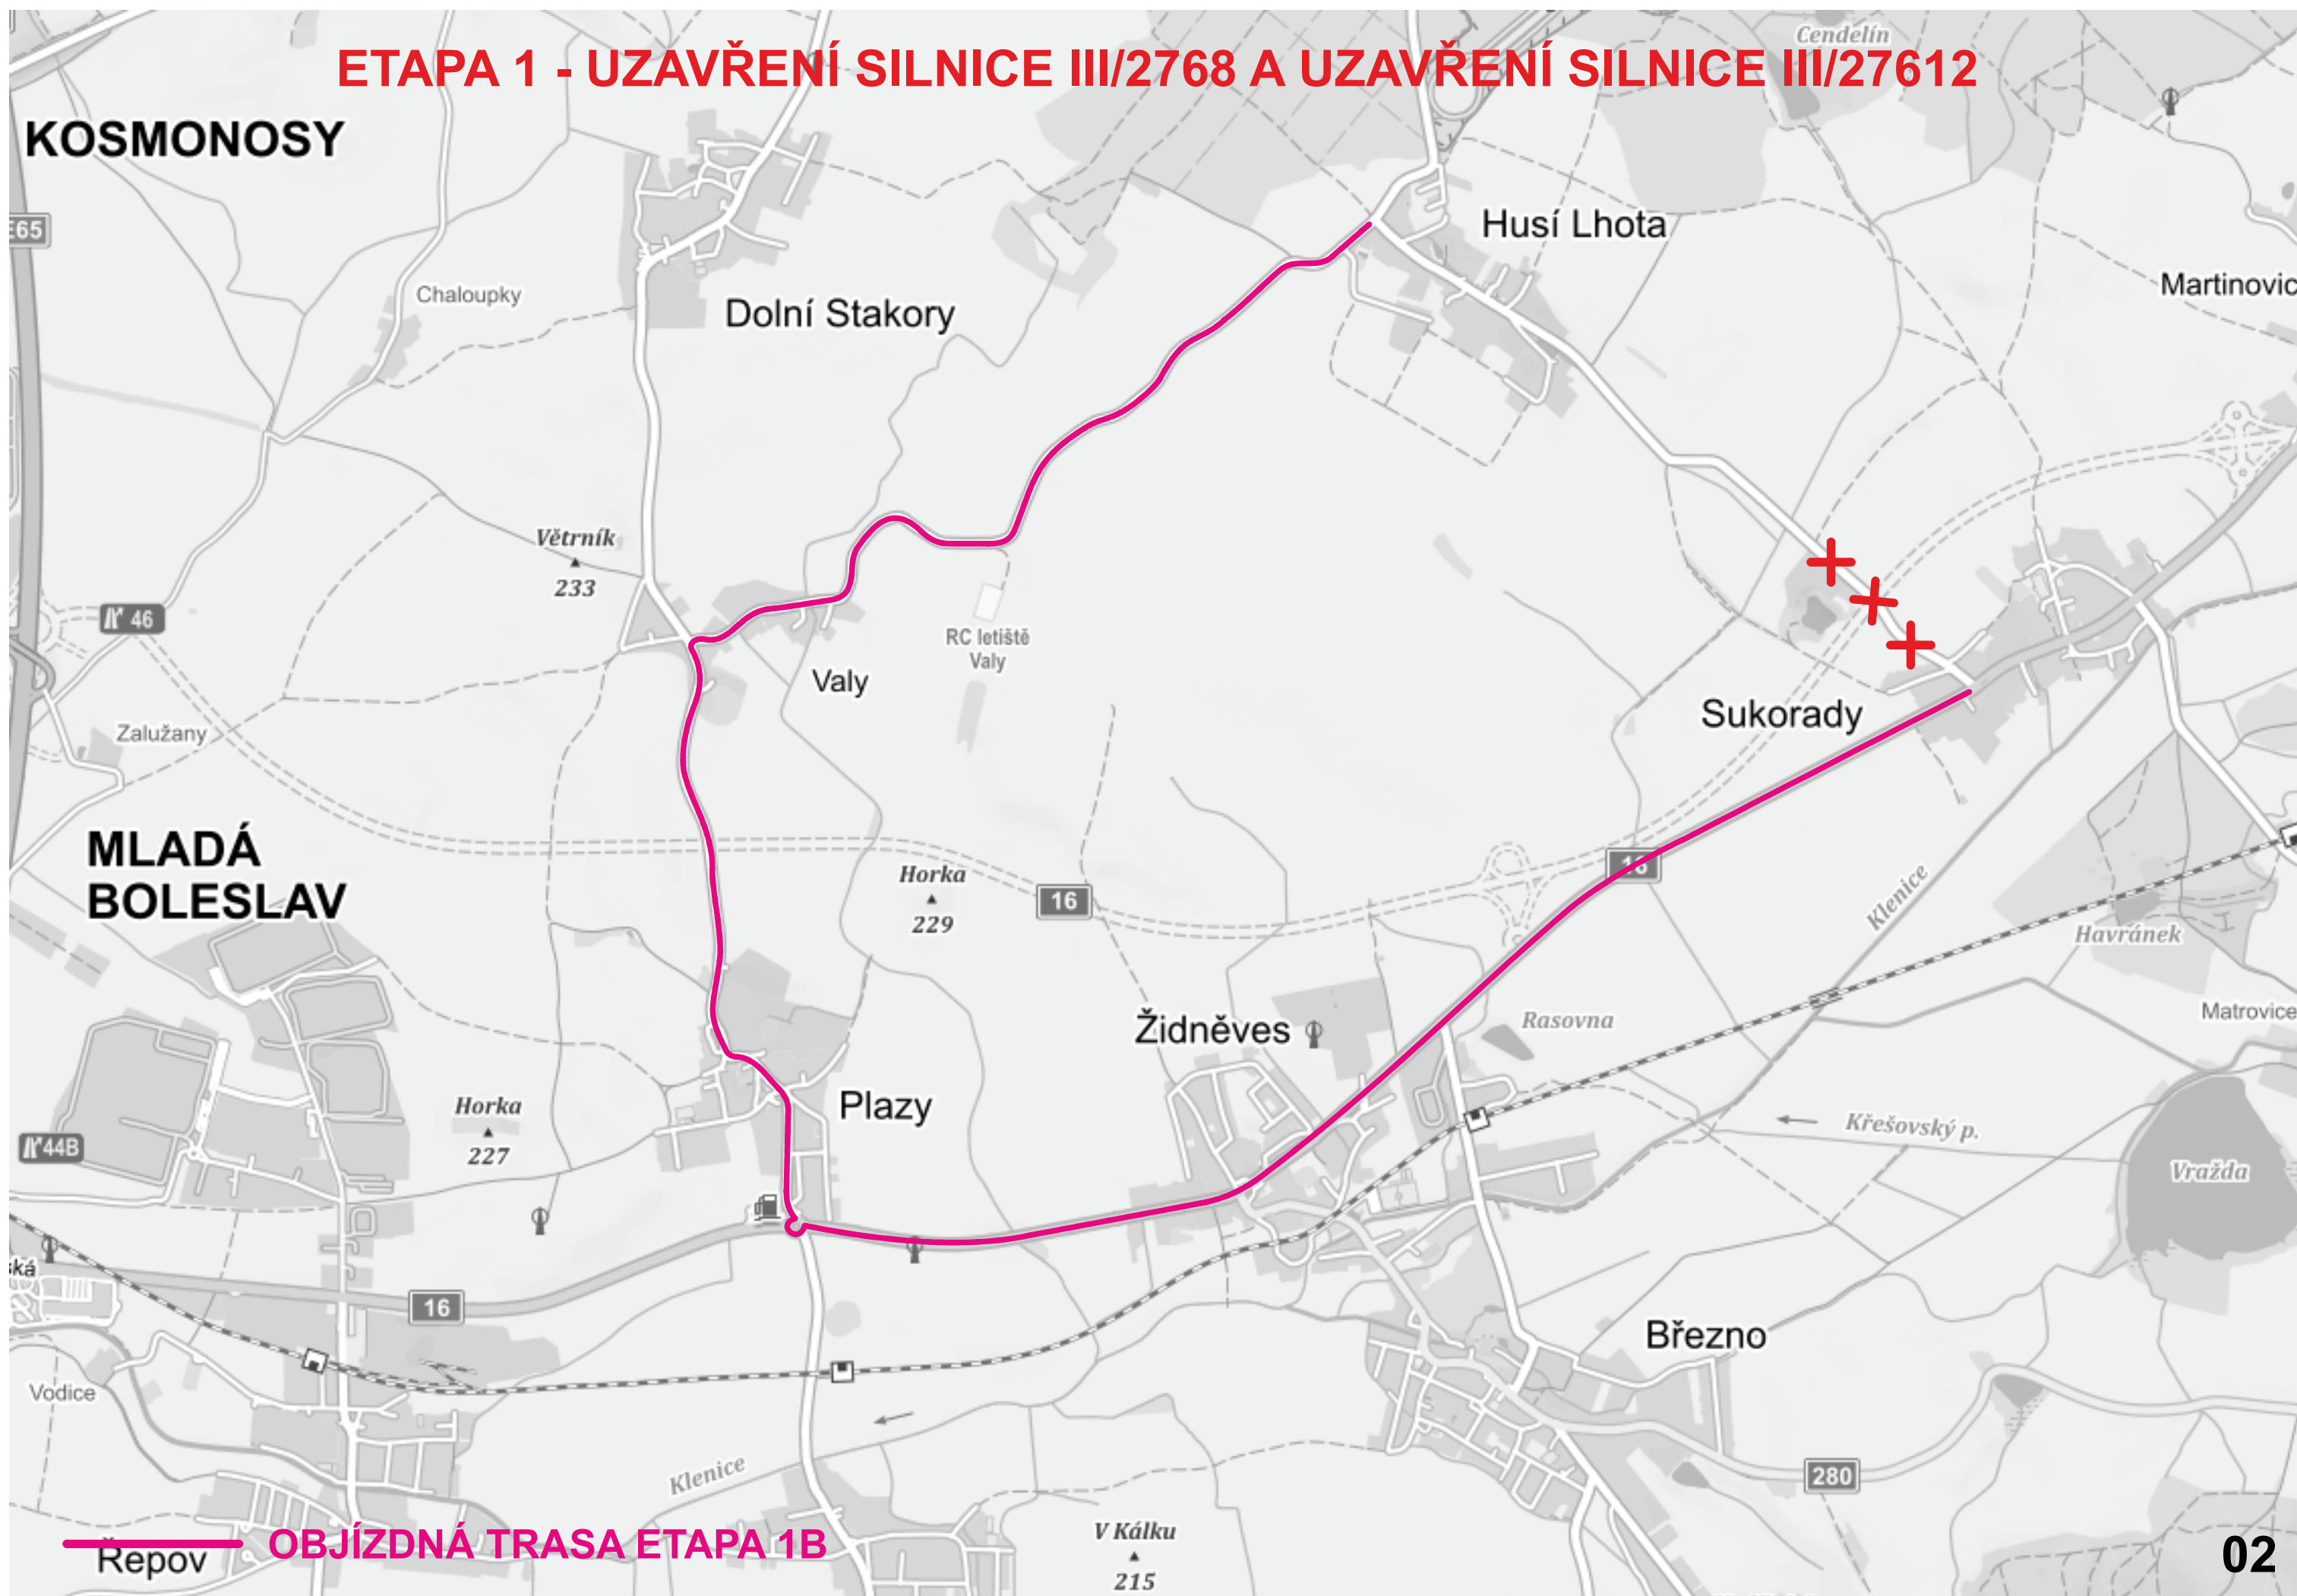


ETAPA 1 — MUK MARTINOVICE

ETAPA 1A

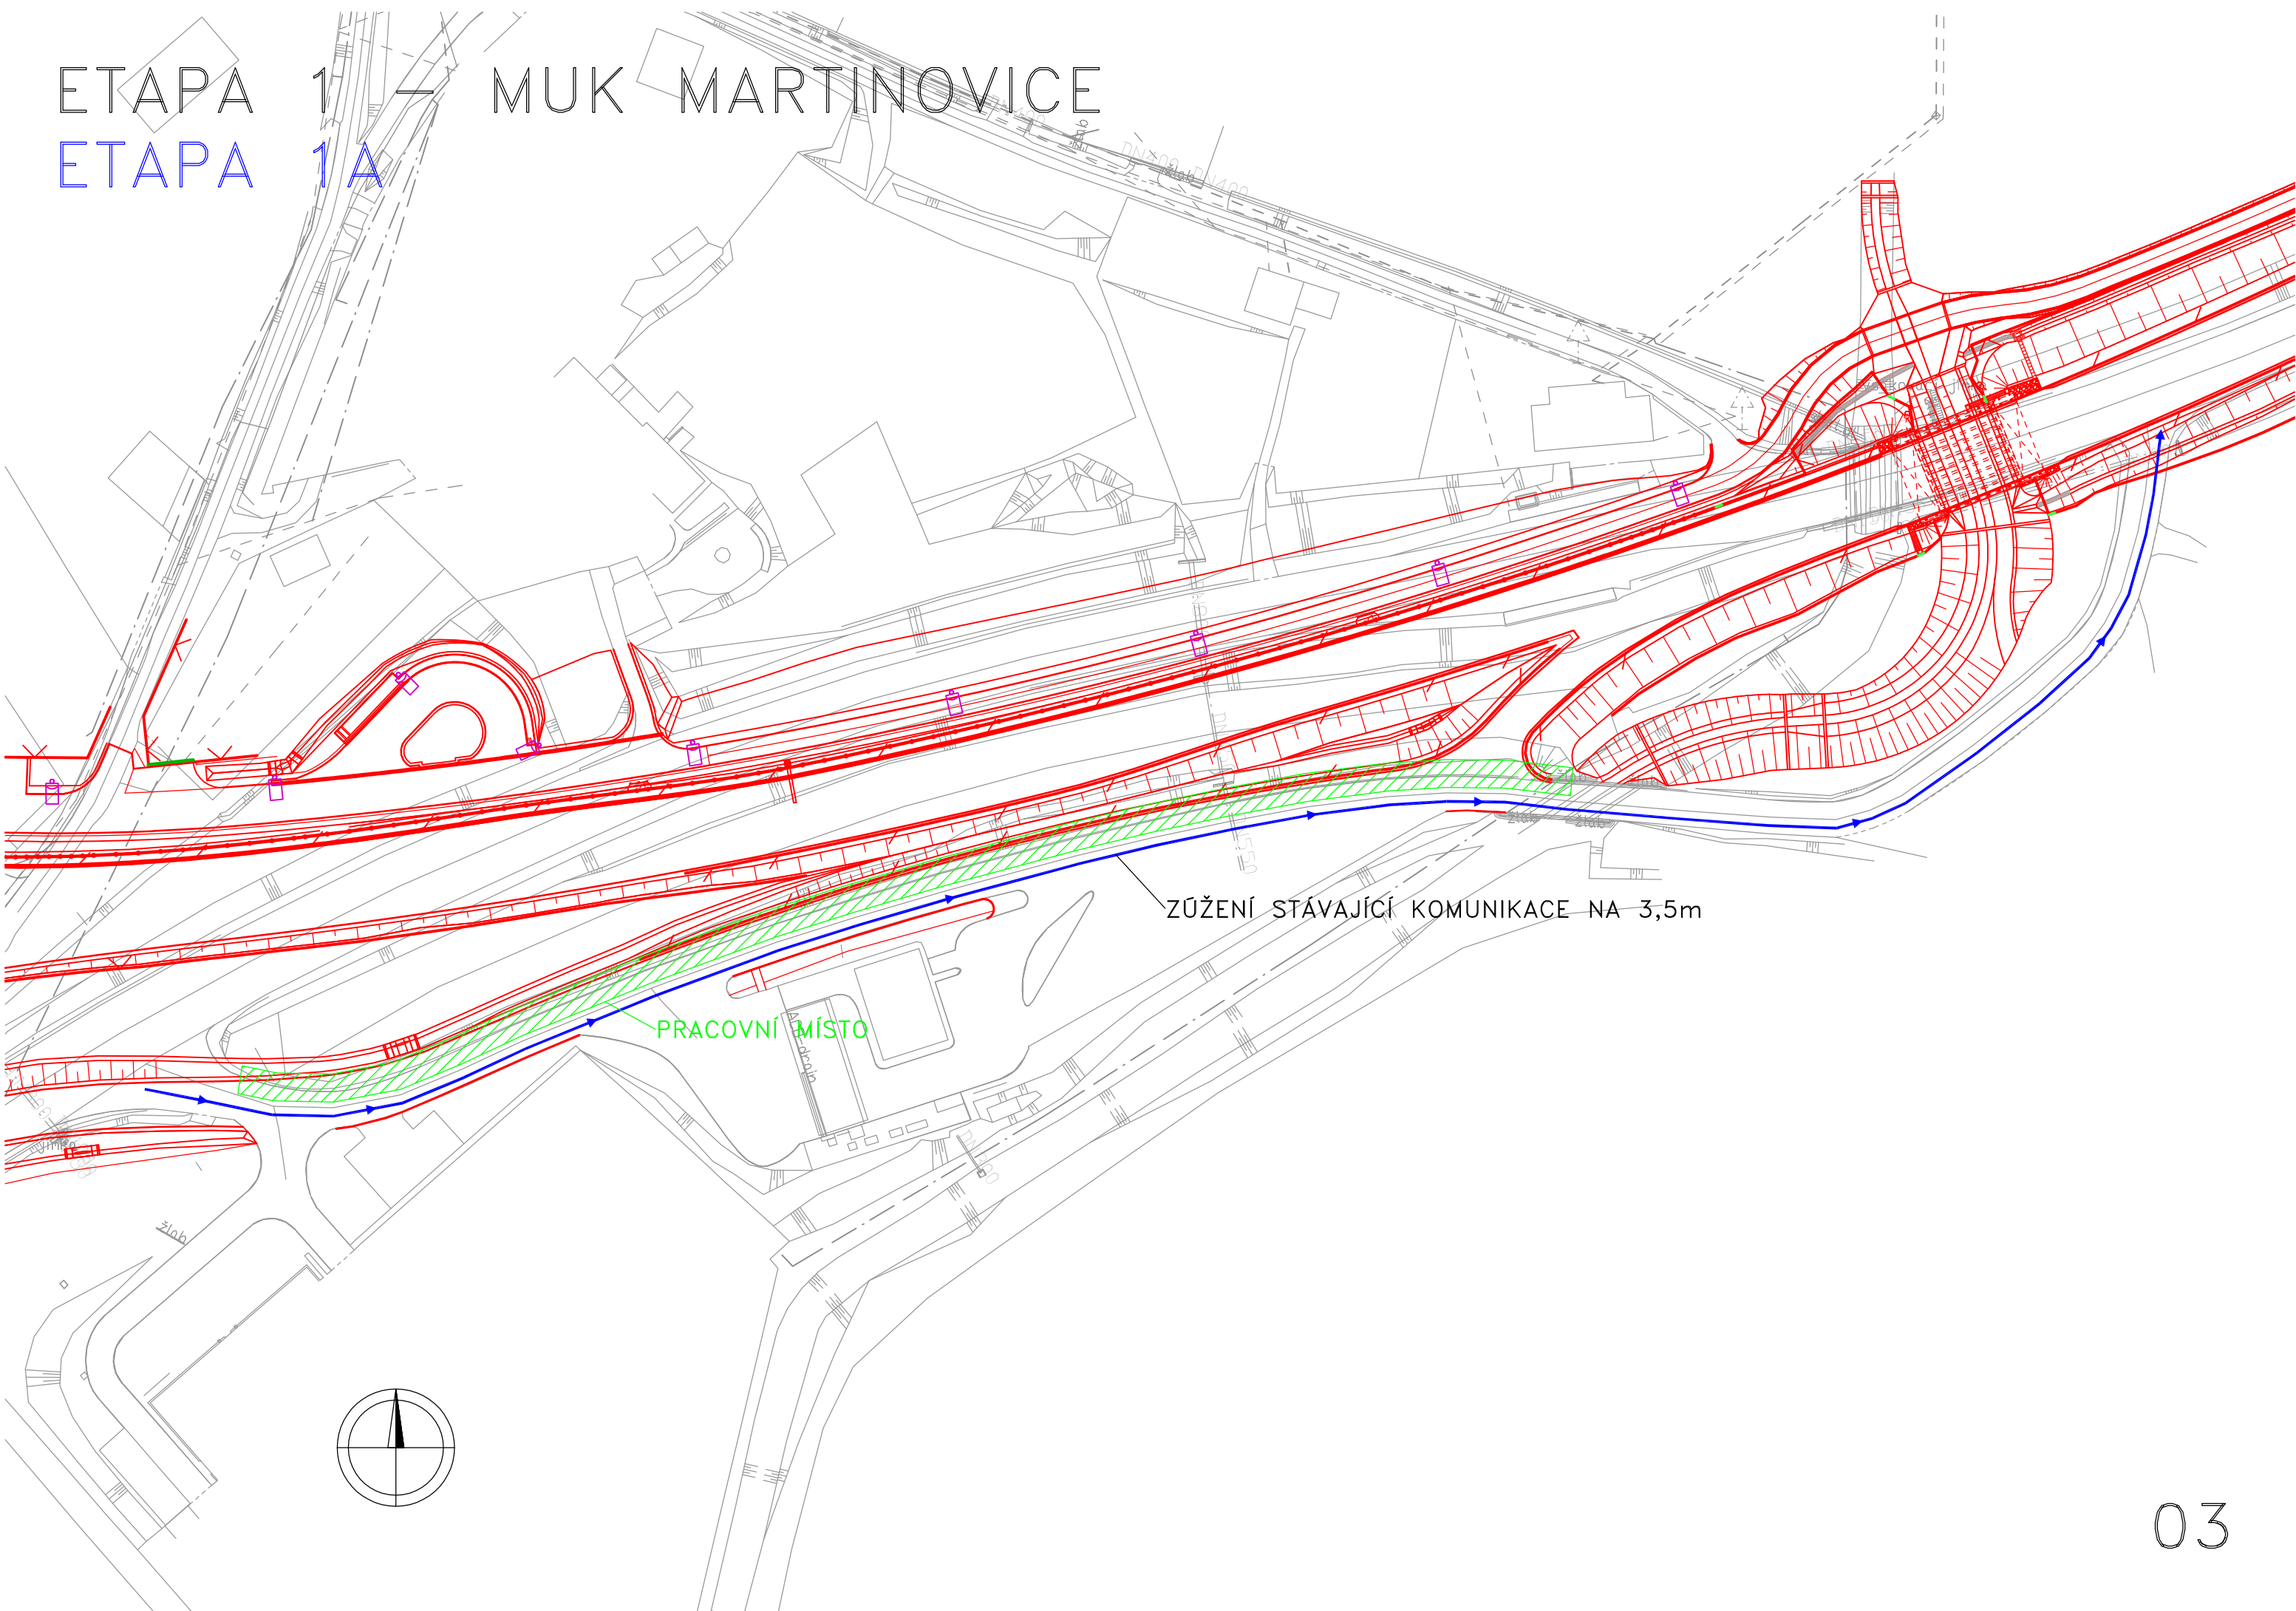

ETAPA 1 – MUK MARTINOVICE


ETAPA 1B

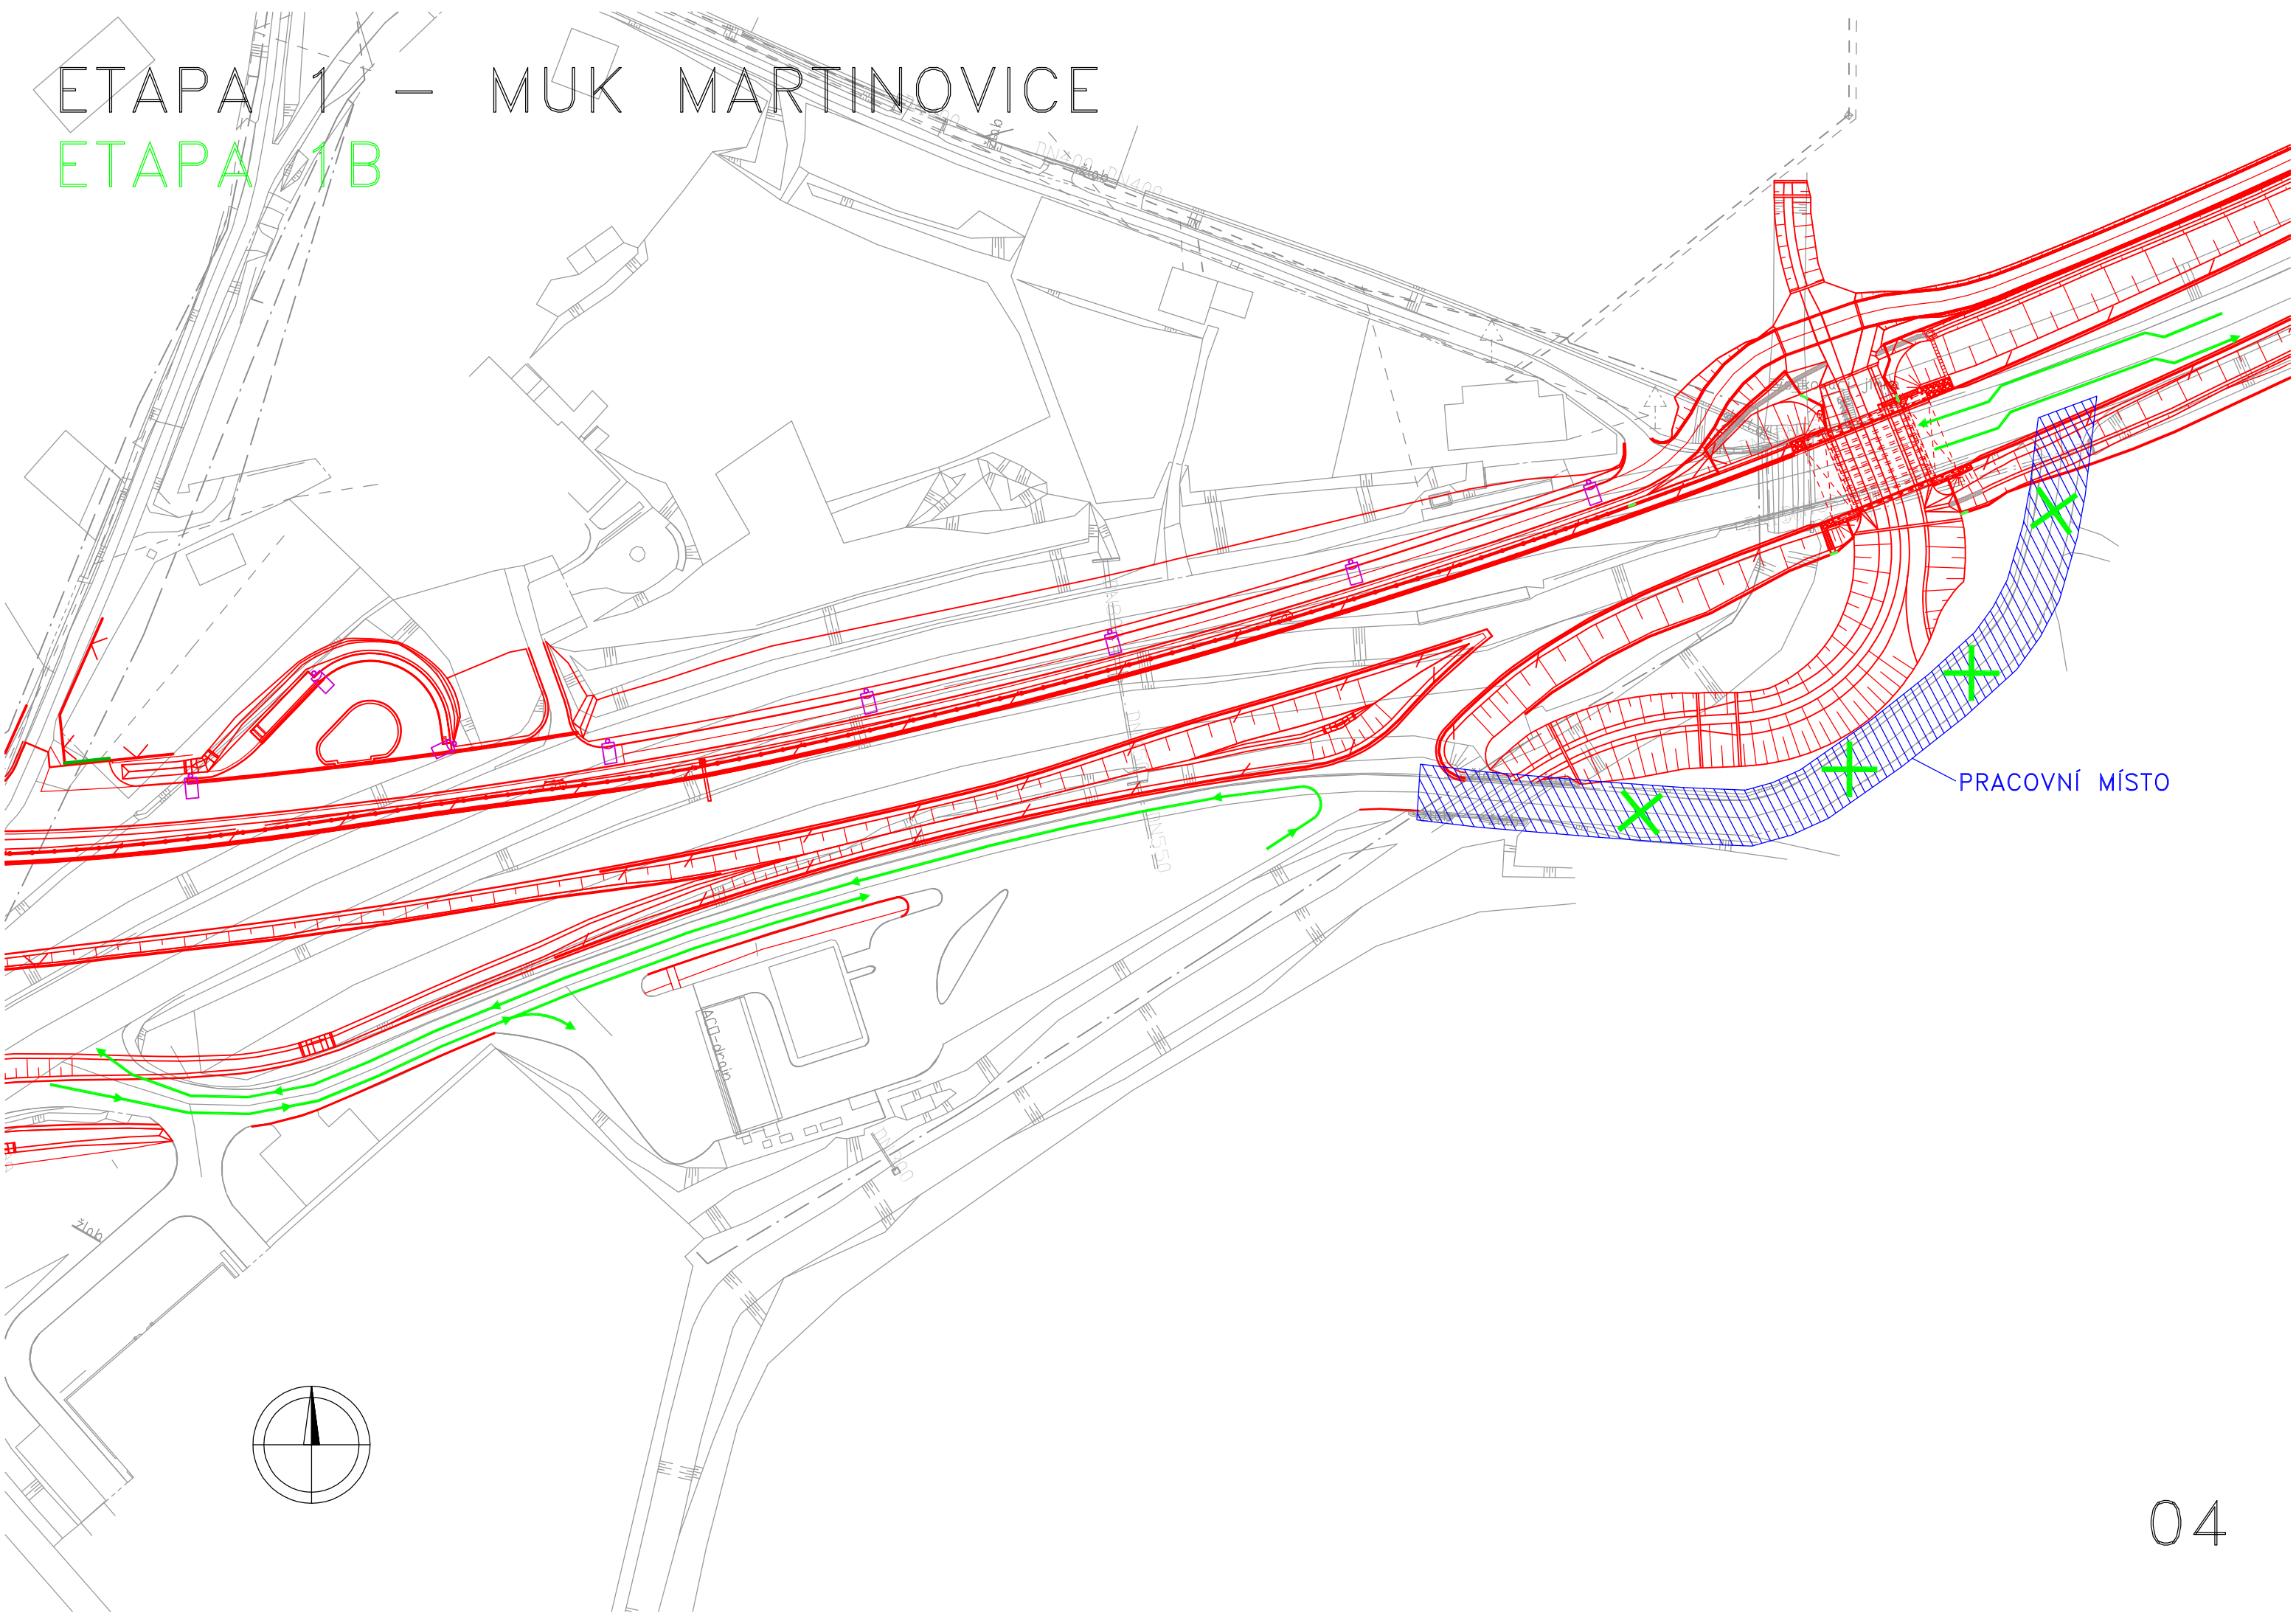


ETAPA 2 - PŘÍSTUP DO MARTINOVIC



ETAPA 2 — MUK MARTINOVICE

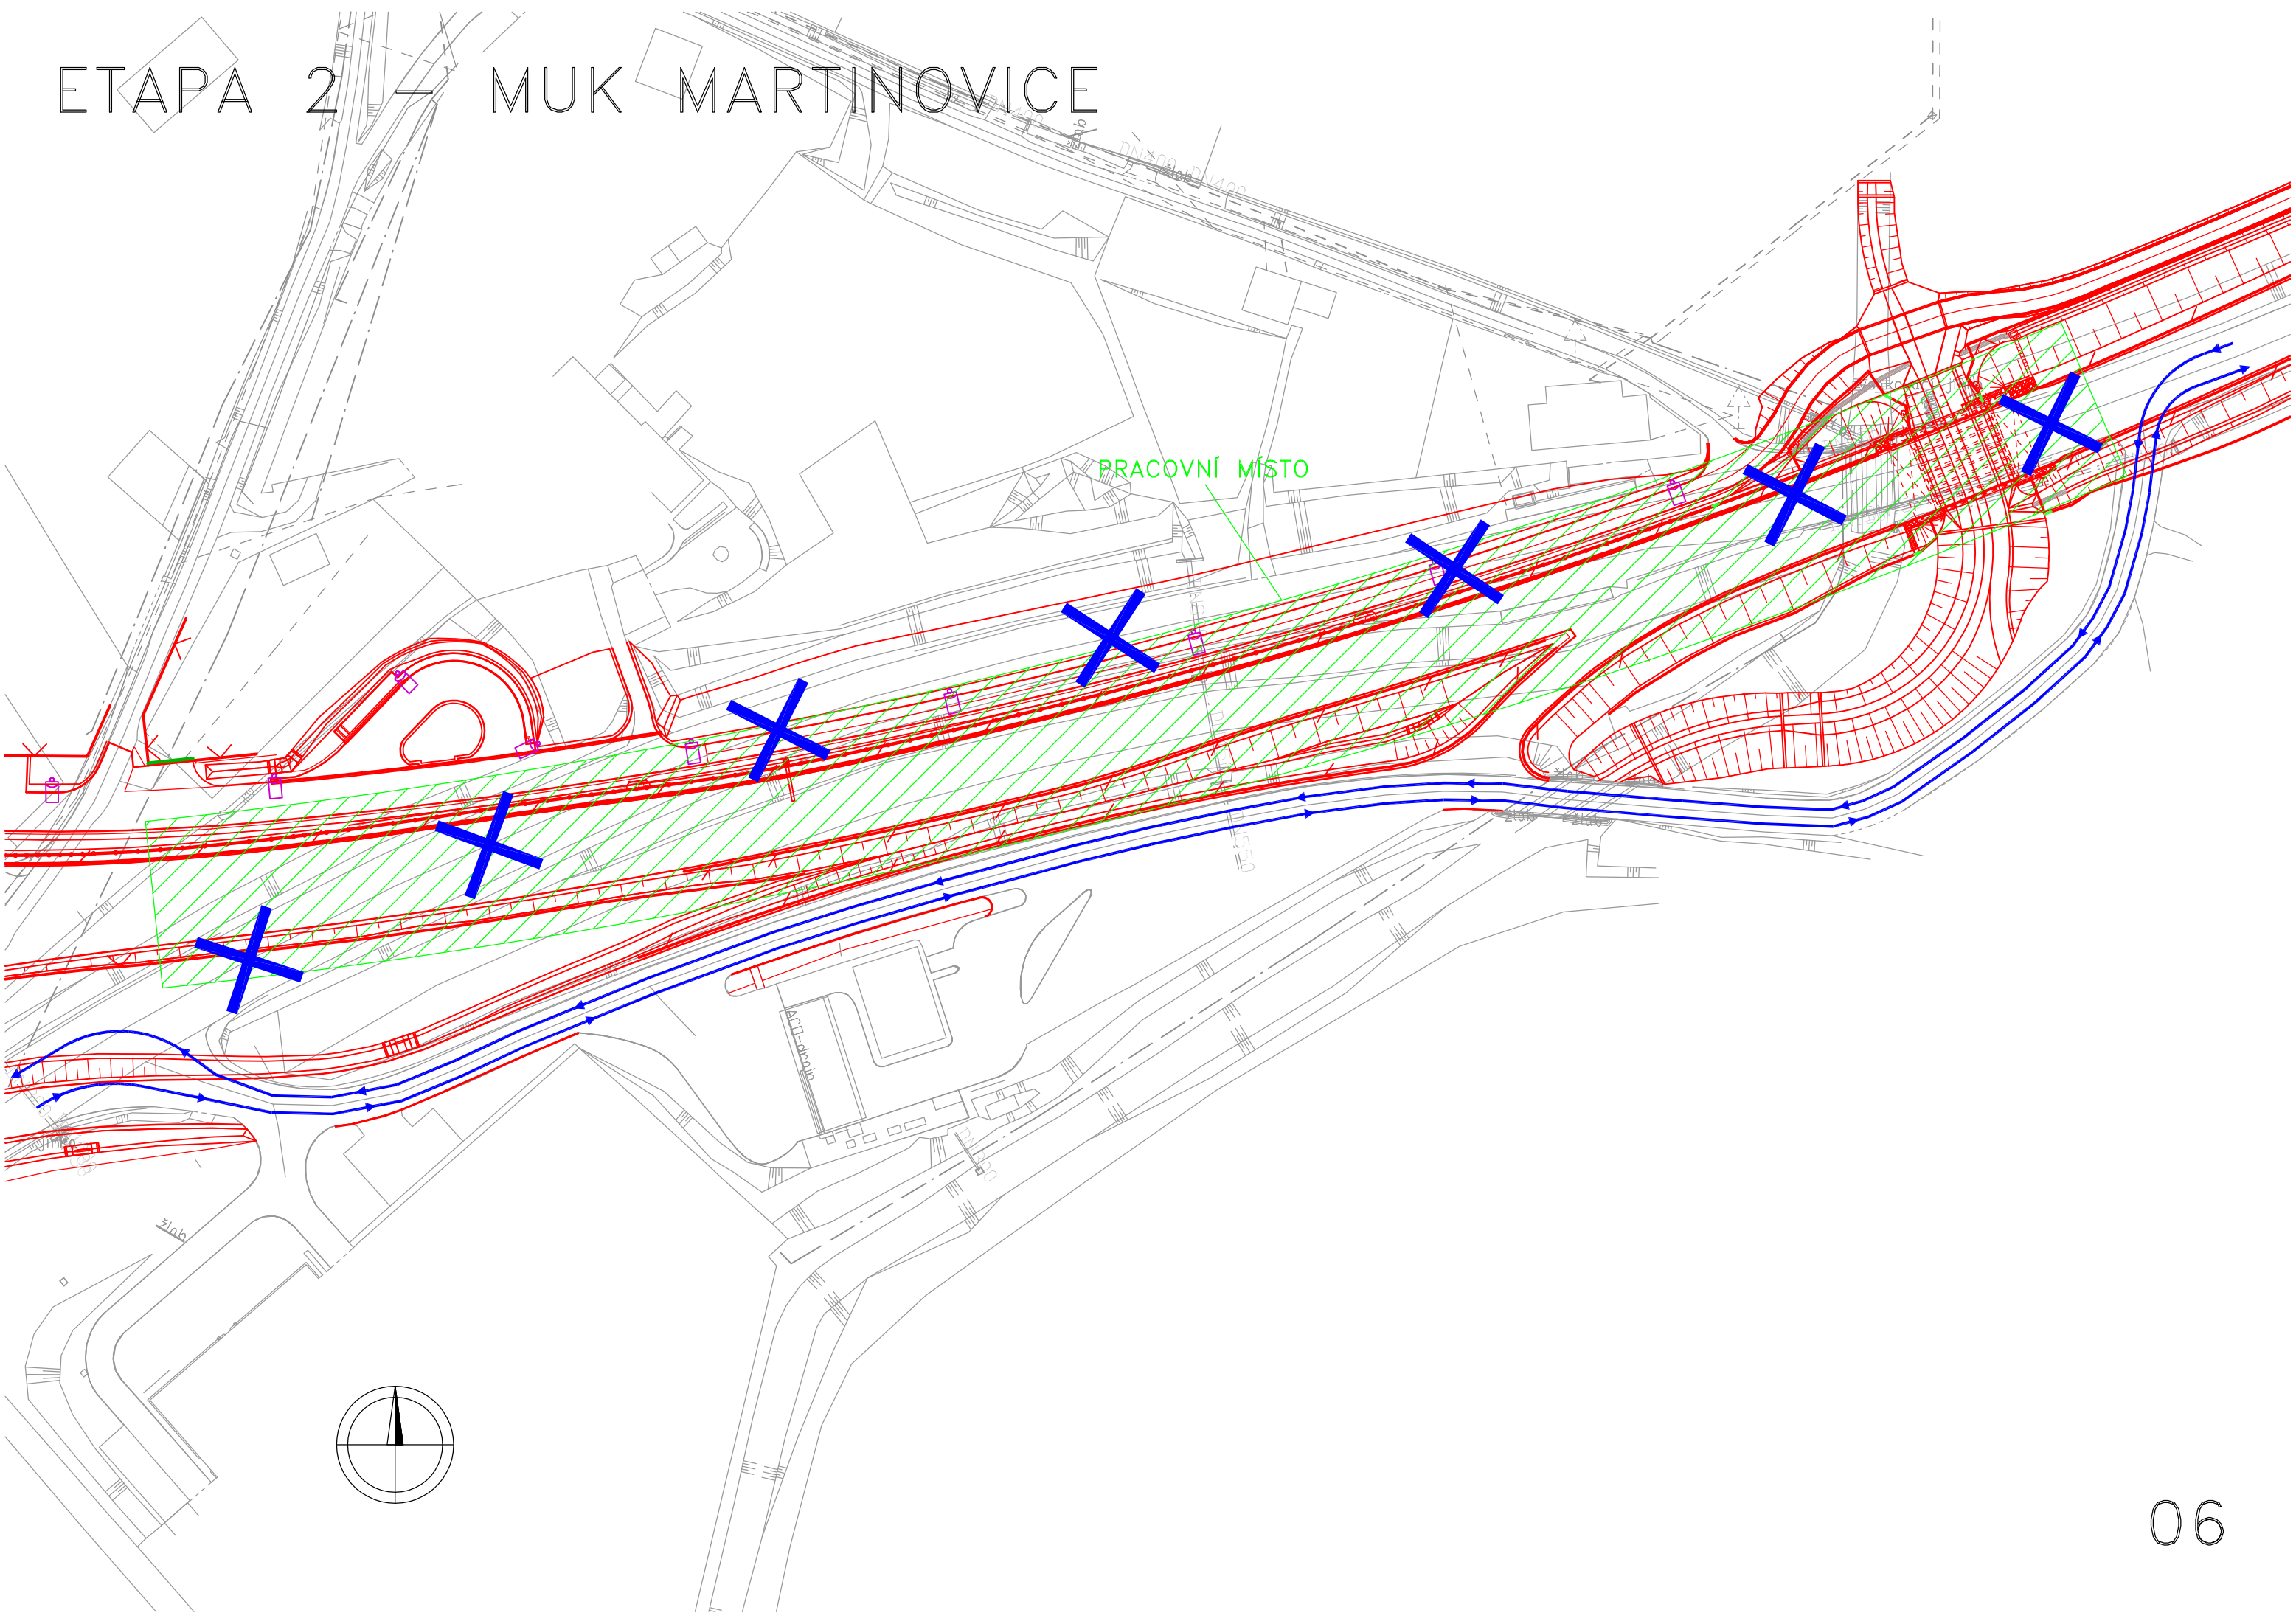


ETAPA 2 – MUK MARTINOVICE

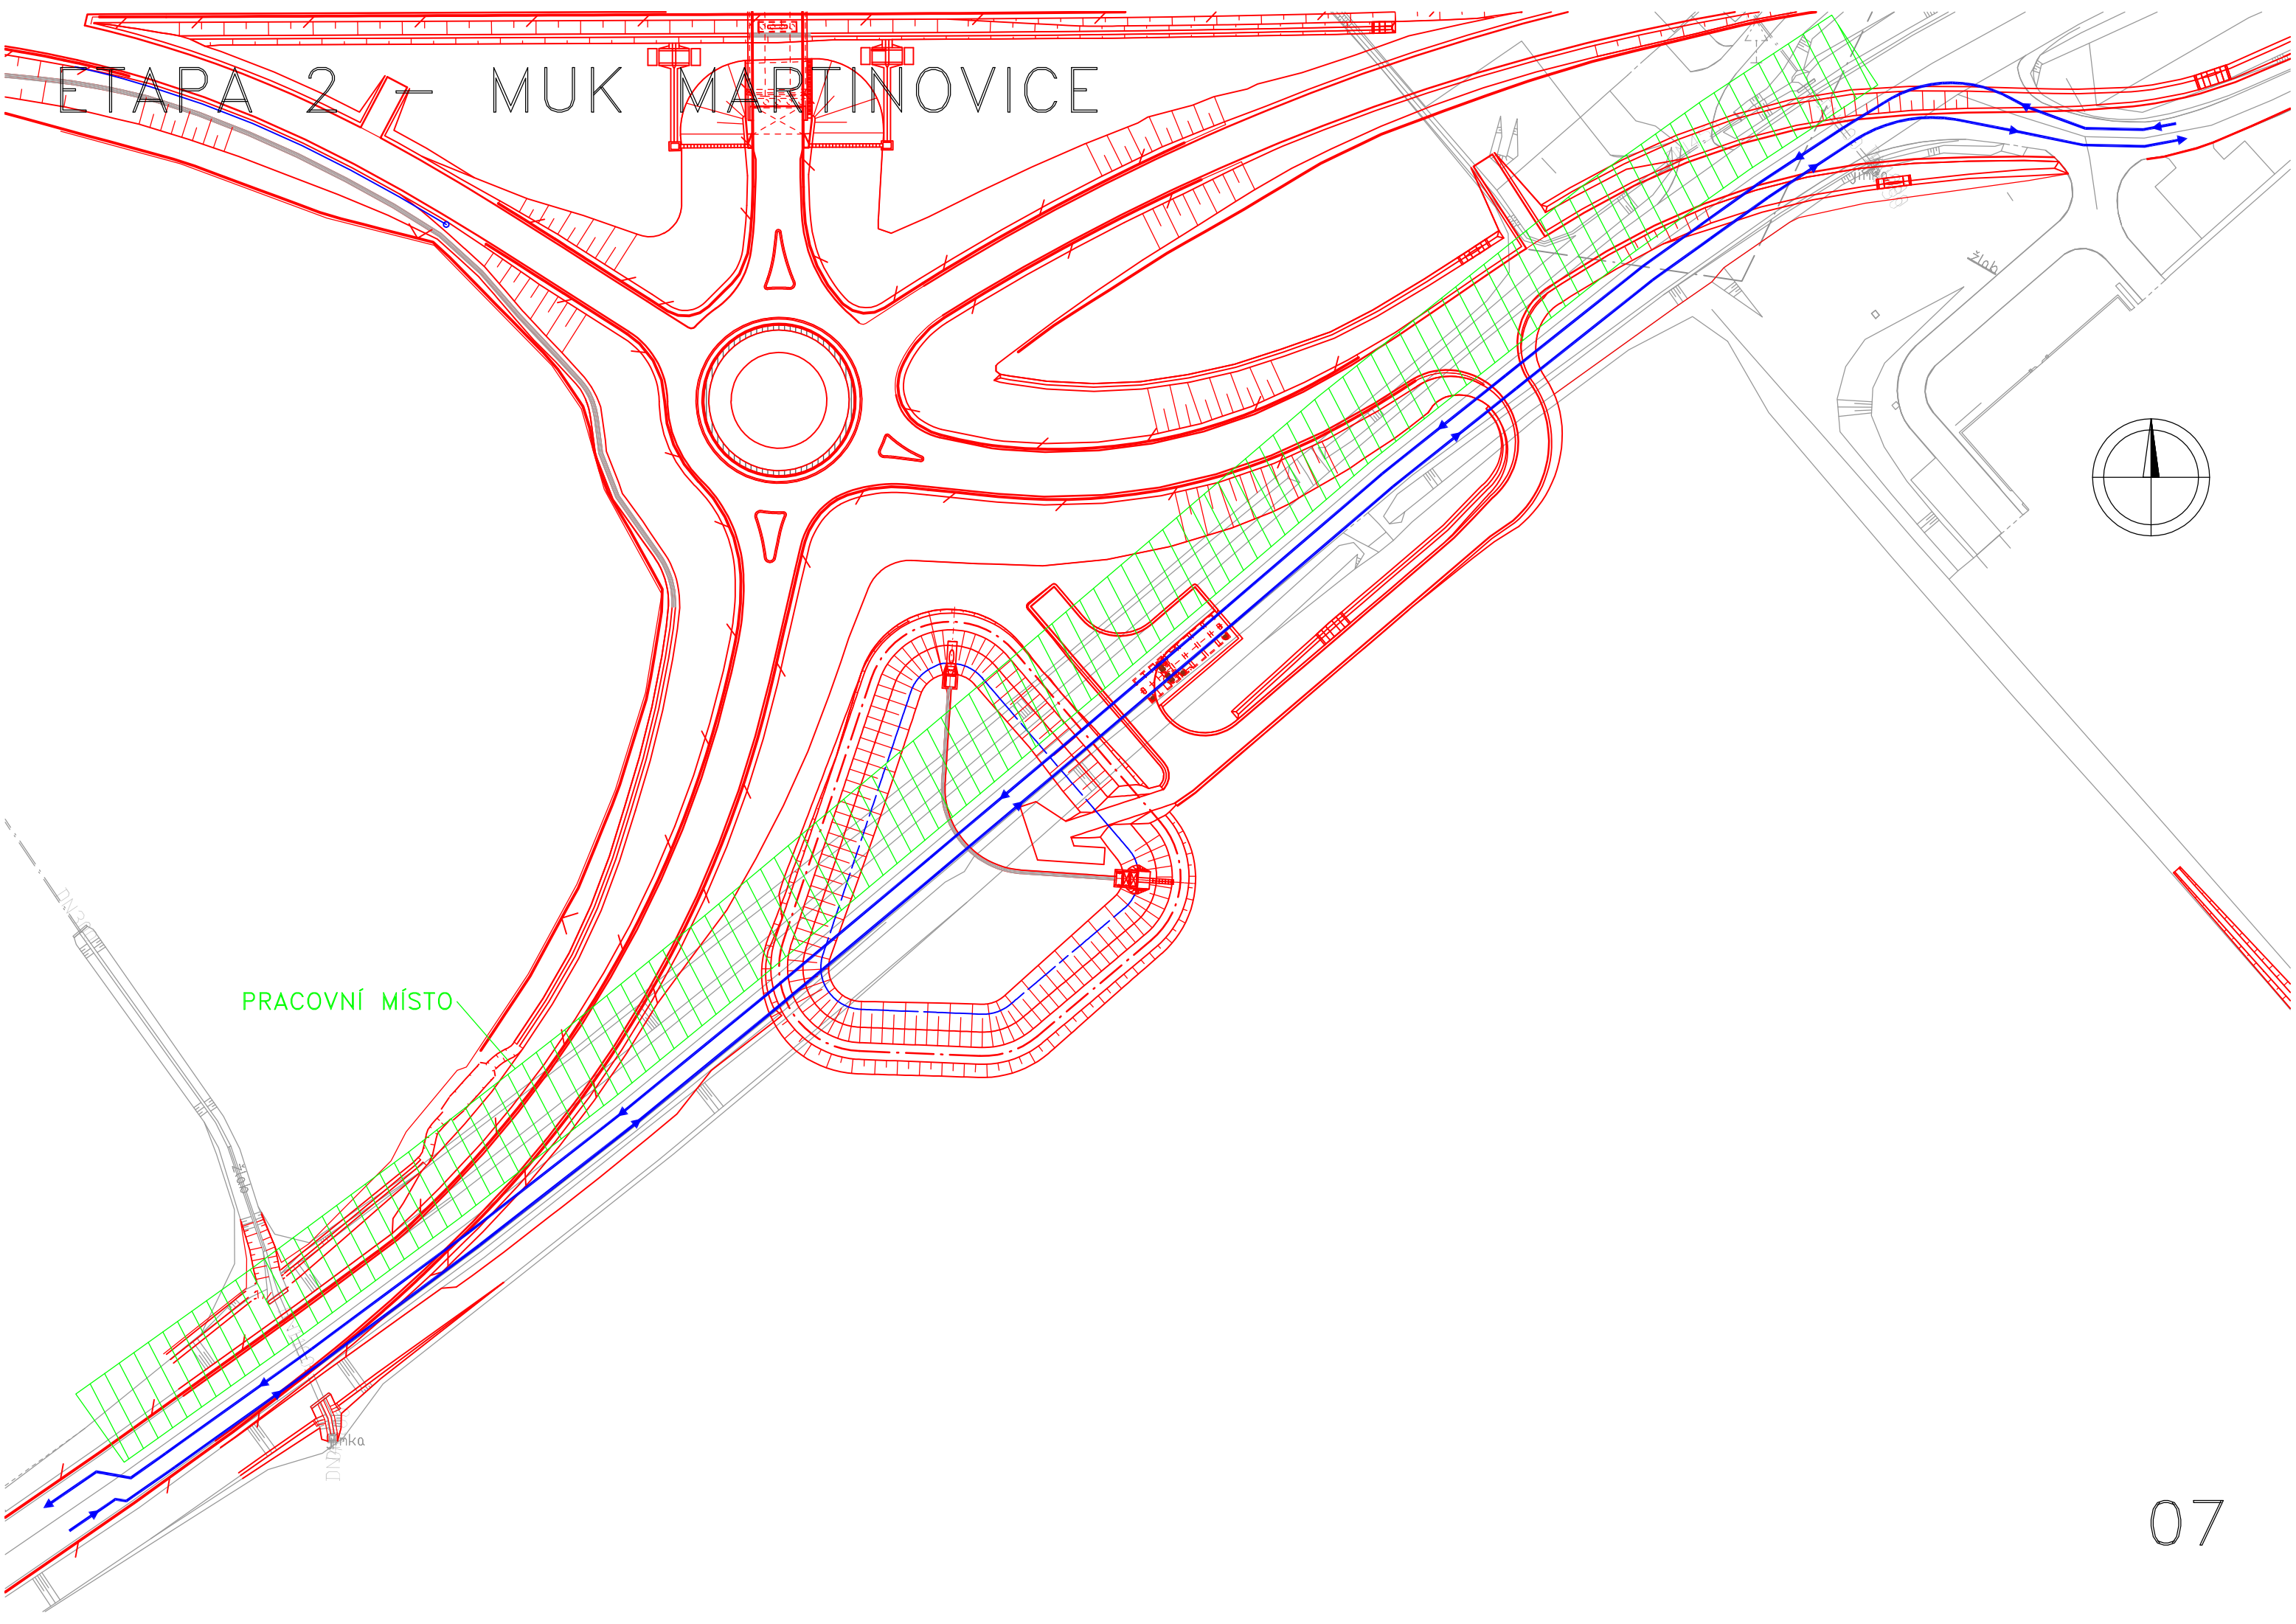

PRACOVNÍ MÍSTO


NAPOJENÍ OK V MUK ŽIDNĚVES

ETAPA 2

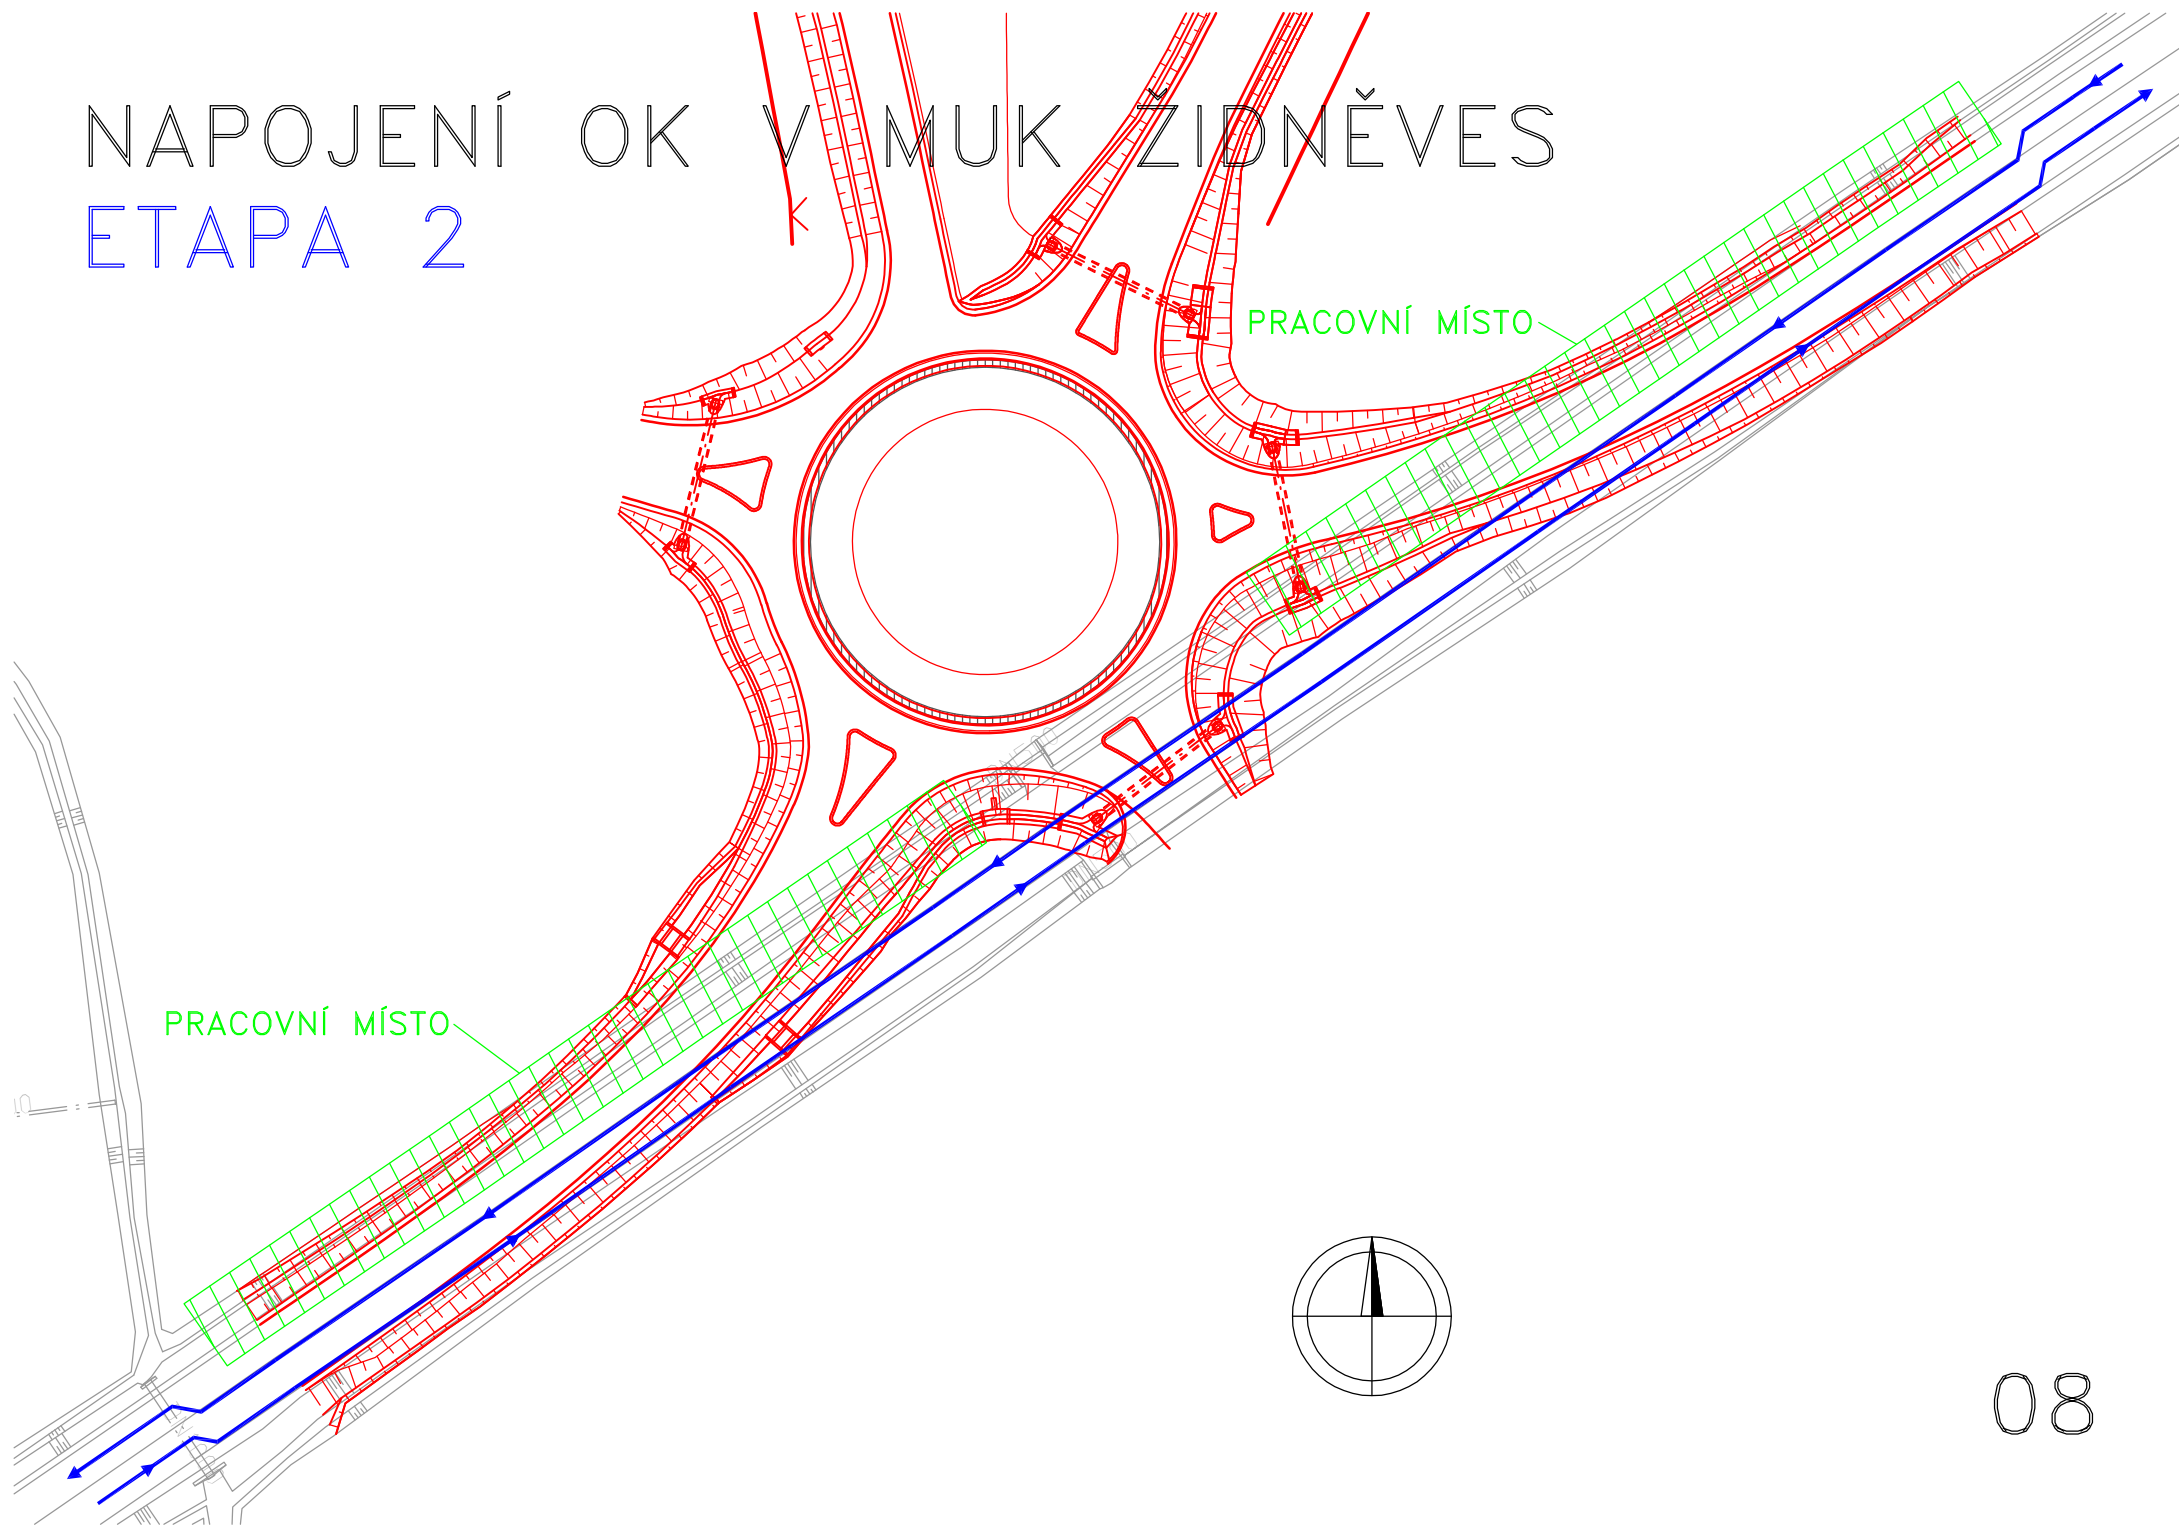


NAPOJENÍ OK V MUK ŽIDNĚVES

ETAPA 3A

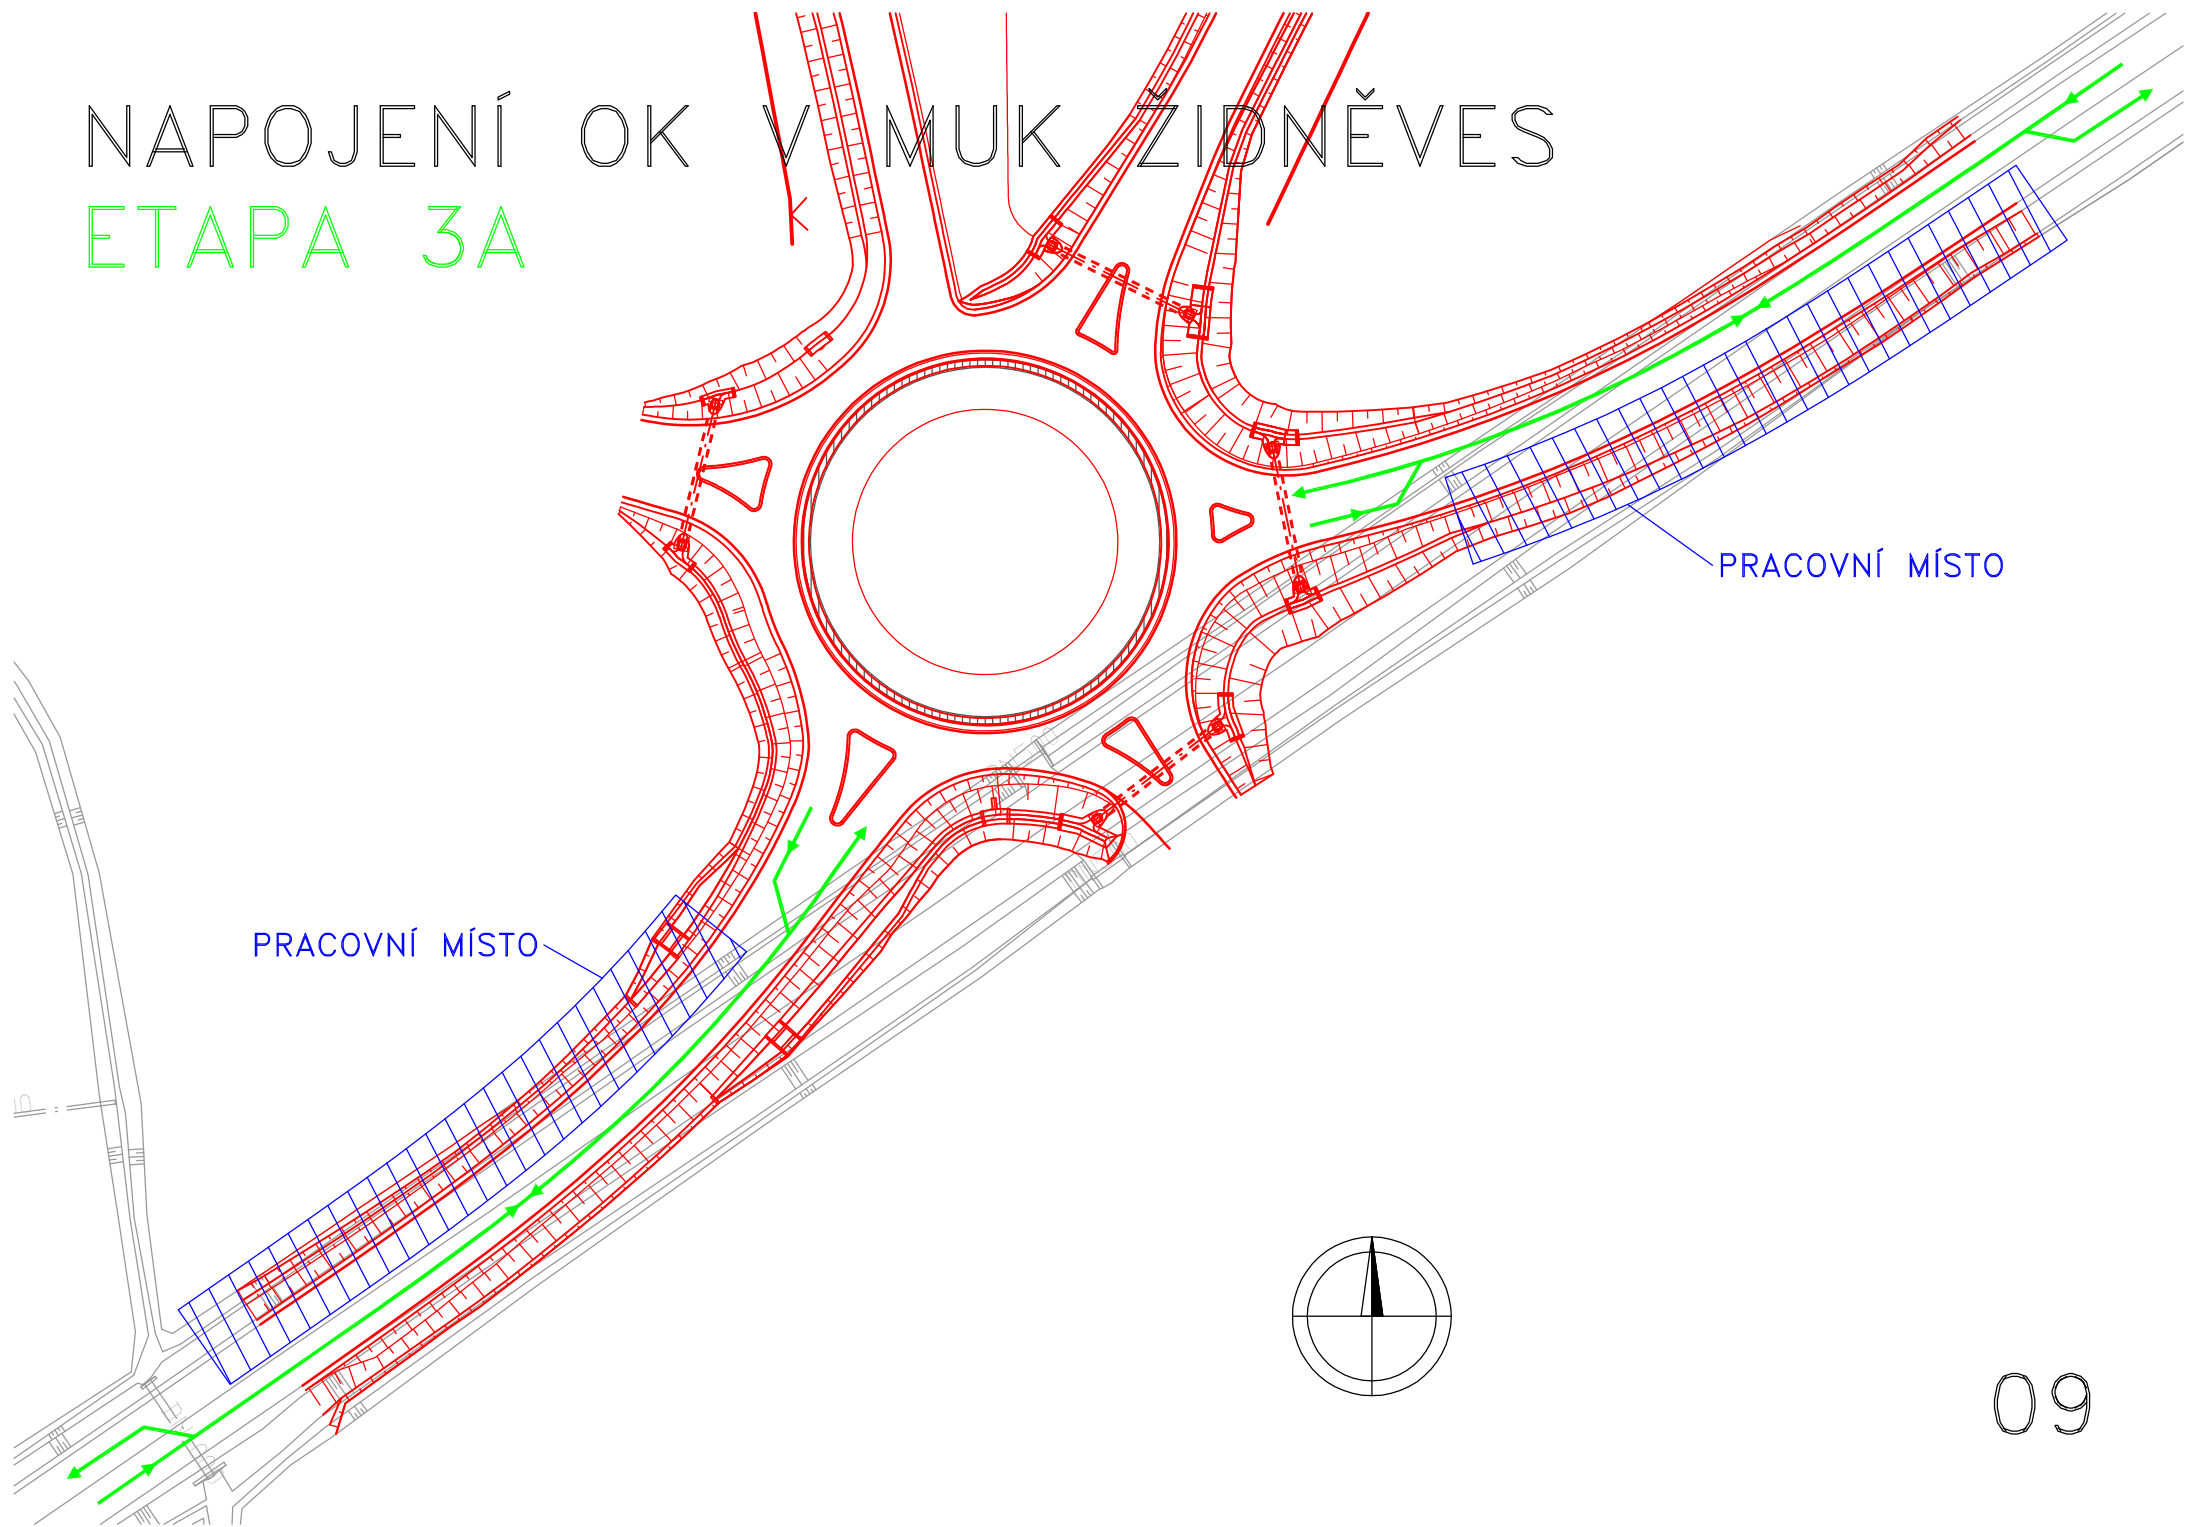


NAPOJENÍ OK V MUK ŽIDNĚVES

ETAPA 3B

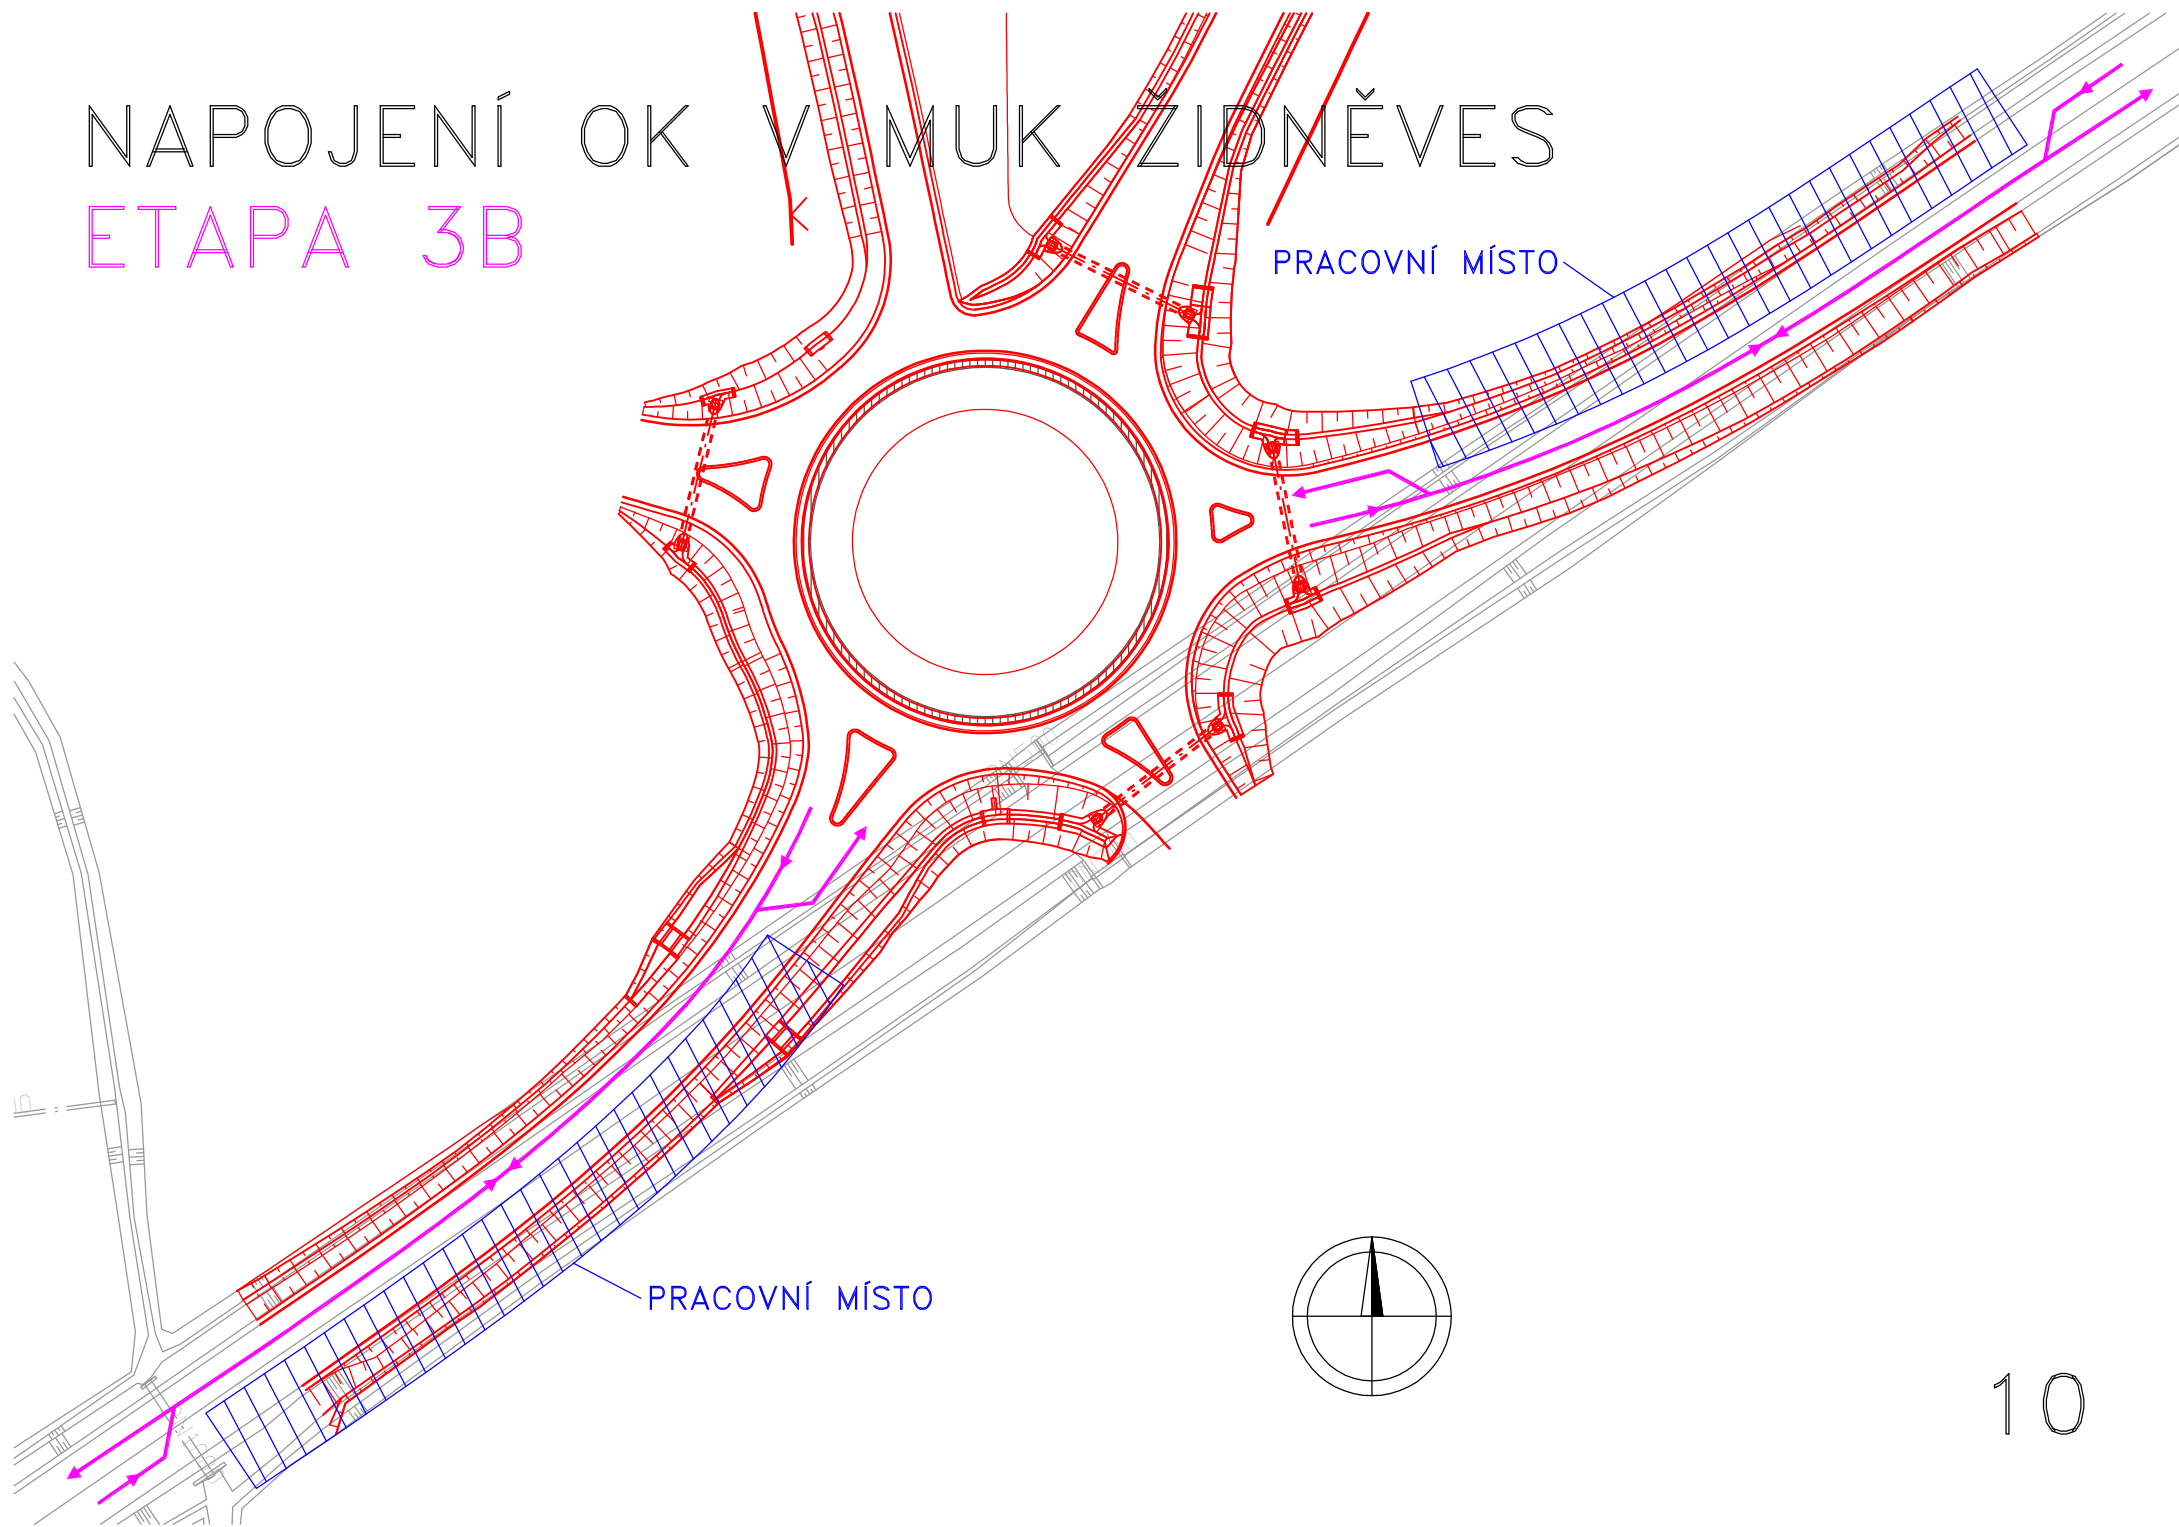

ETAPA 3

PŘIPOJENÍ DUN V KM 5,0 NA STÁVAJÍCÍ I/16

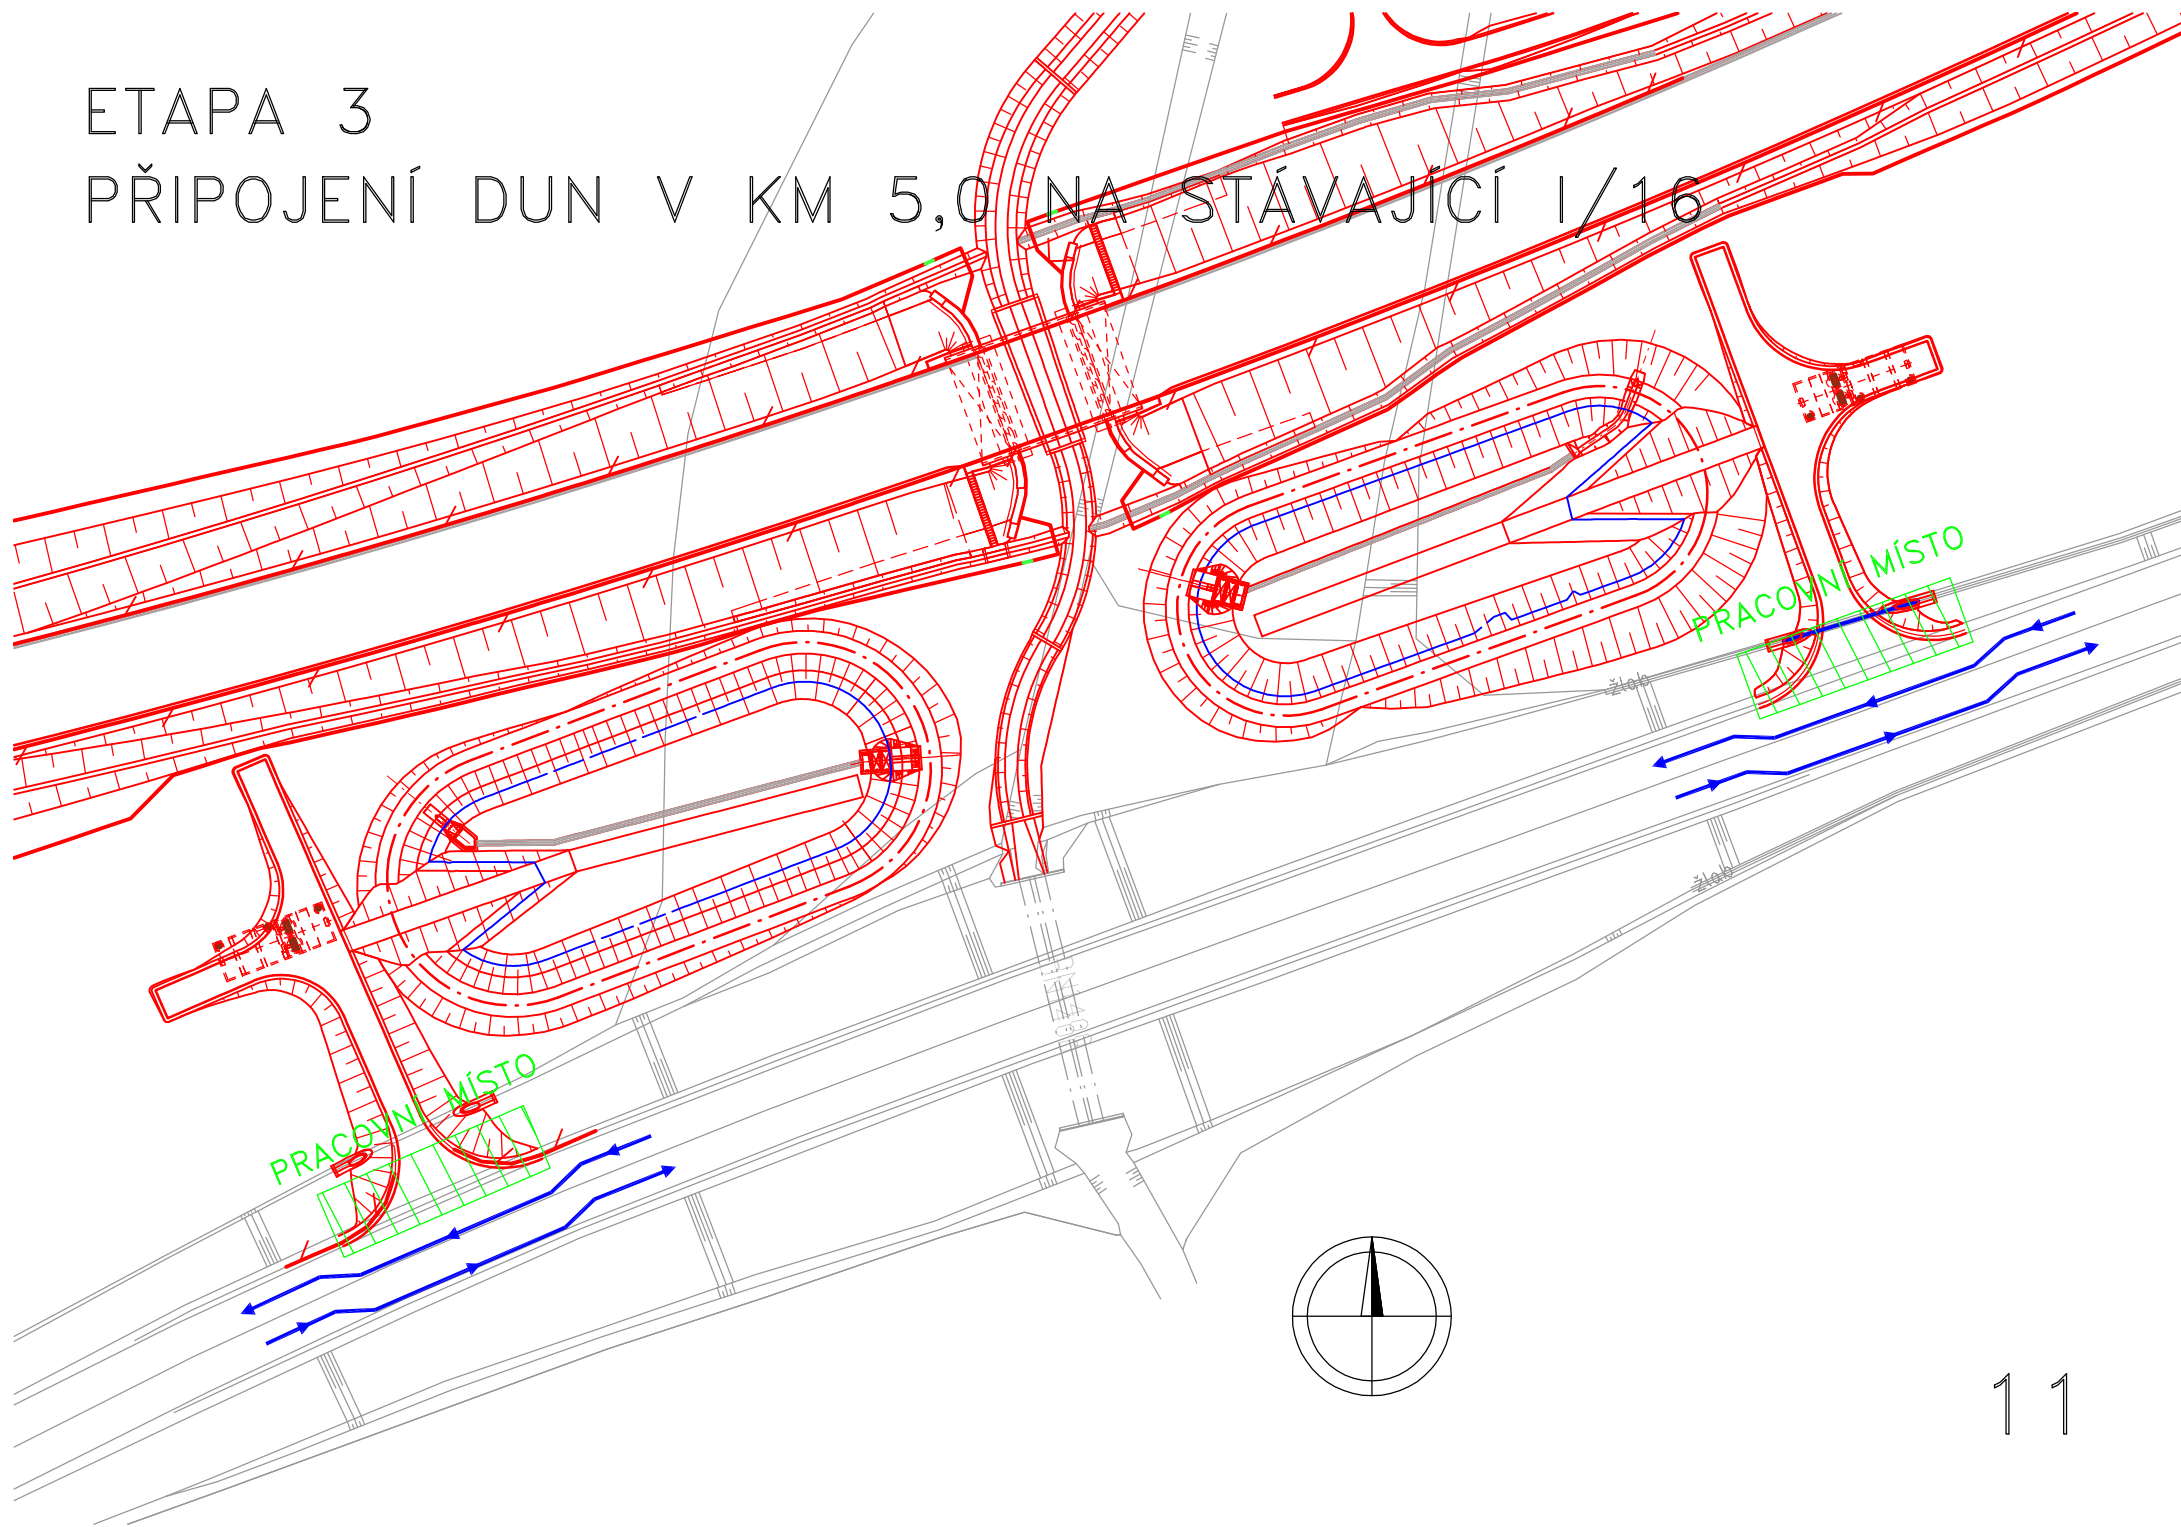


ETAPA 3 – MUK MARTINOVICE

ETAPA 3A


PRACOVNÍ MÍSTO

PRACOVNÍ MÍSTO




ETAPA 3 – MUK MARTINOVICE

ETAPA 3B

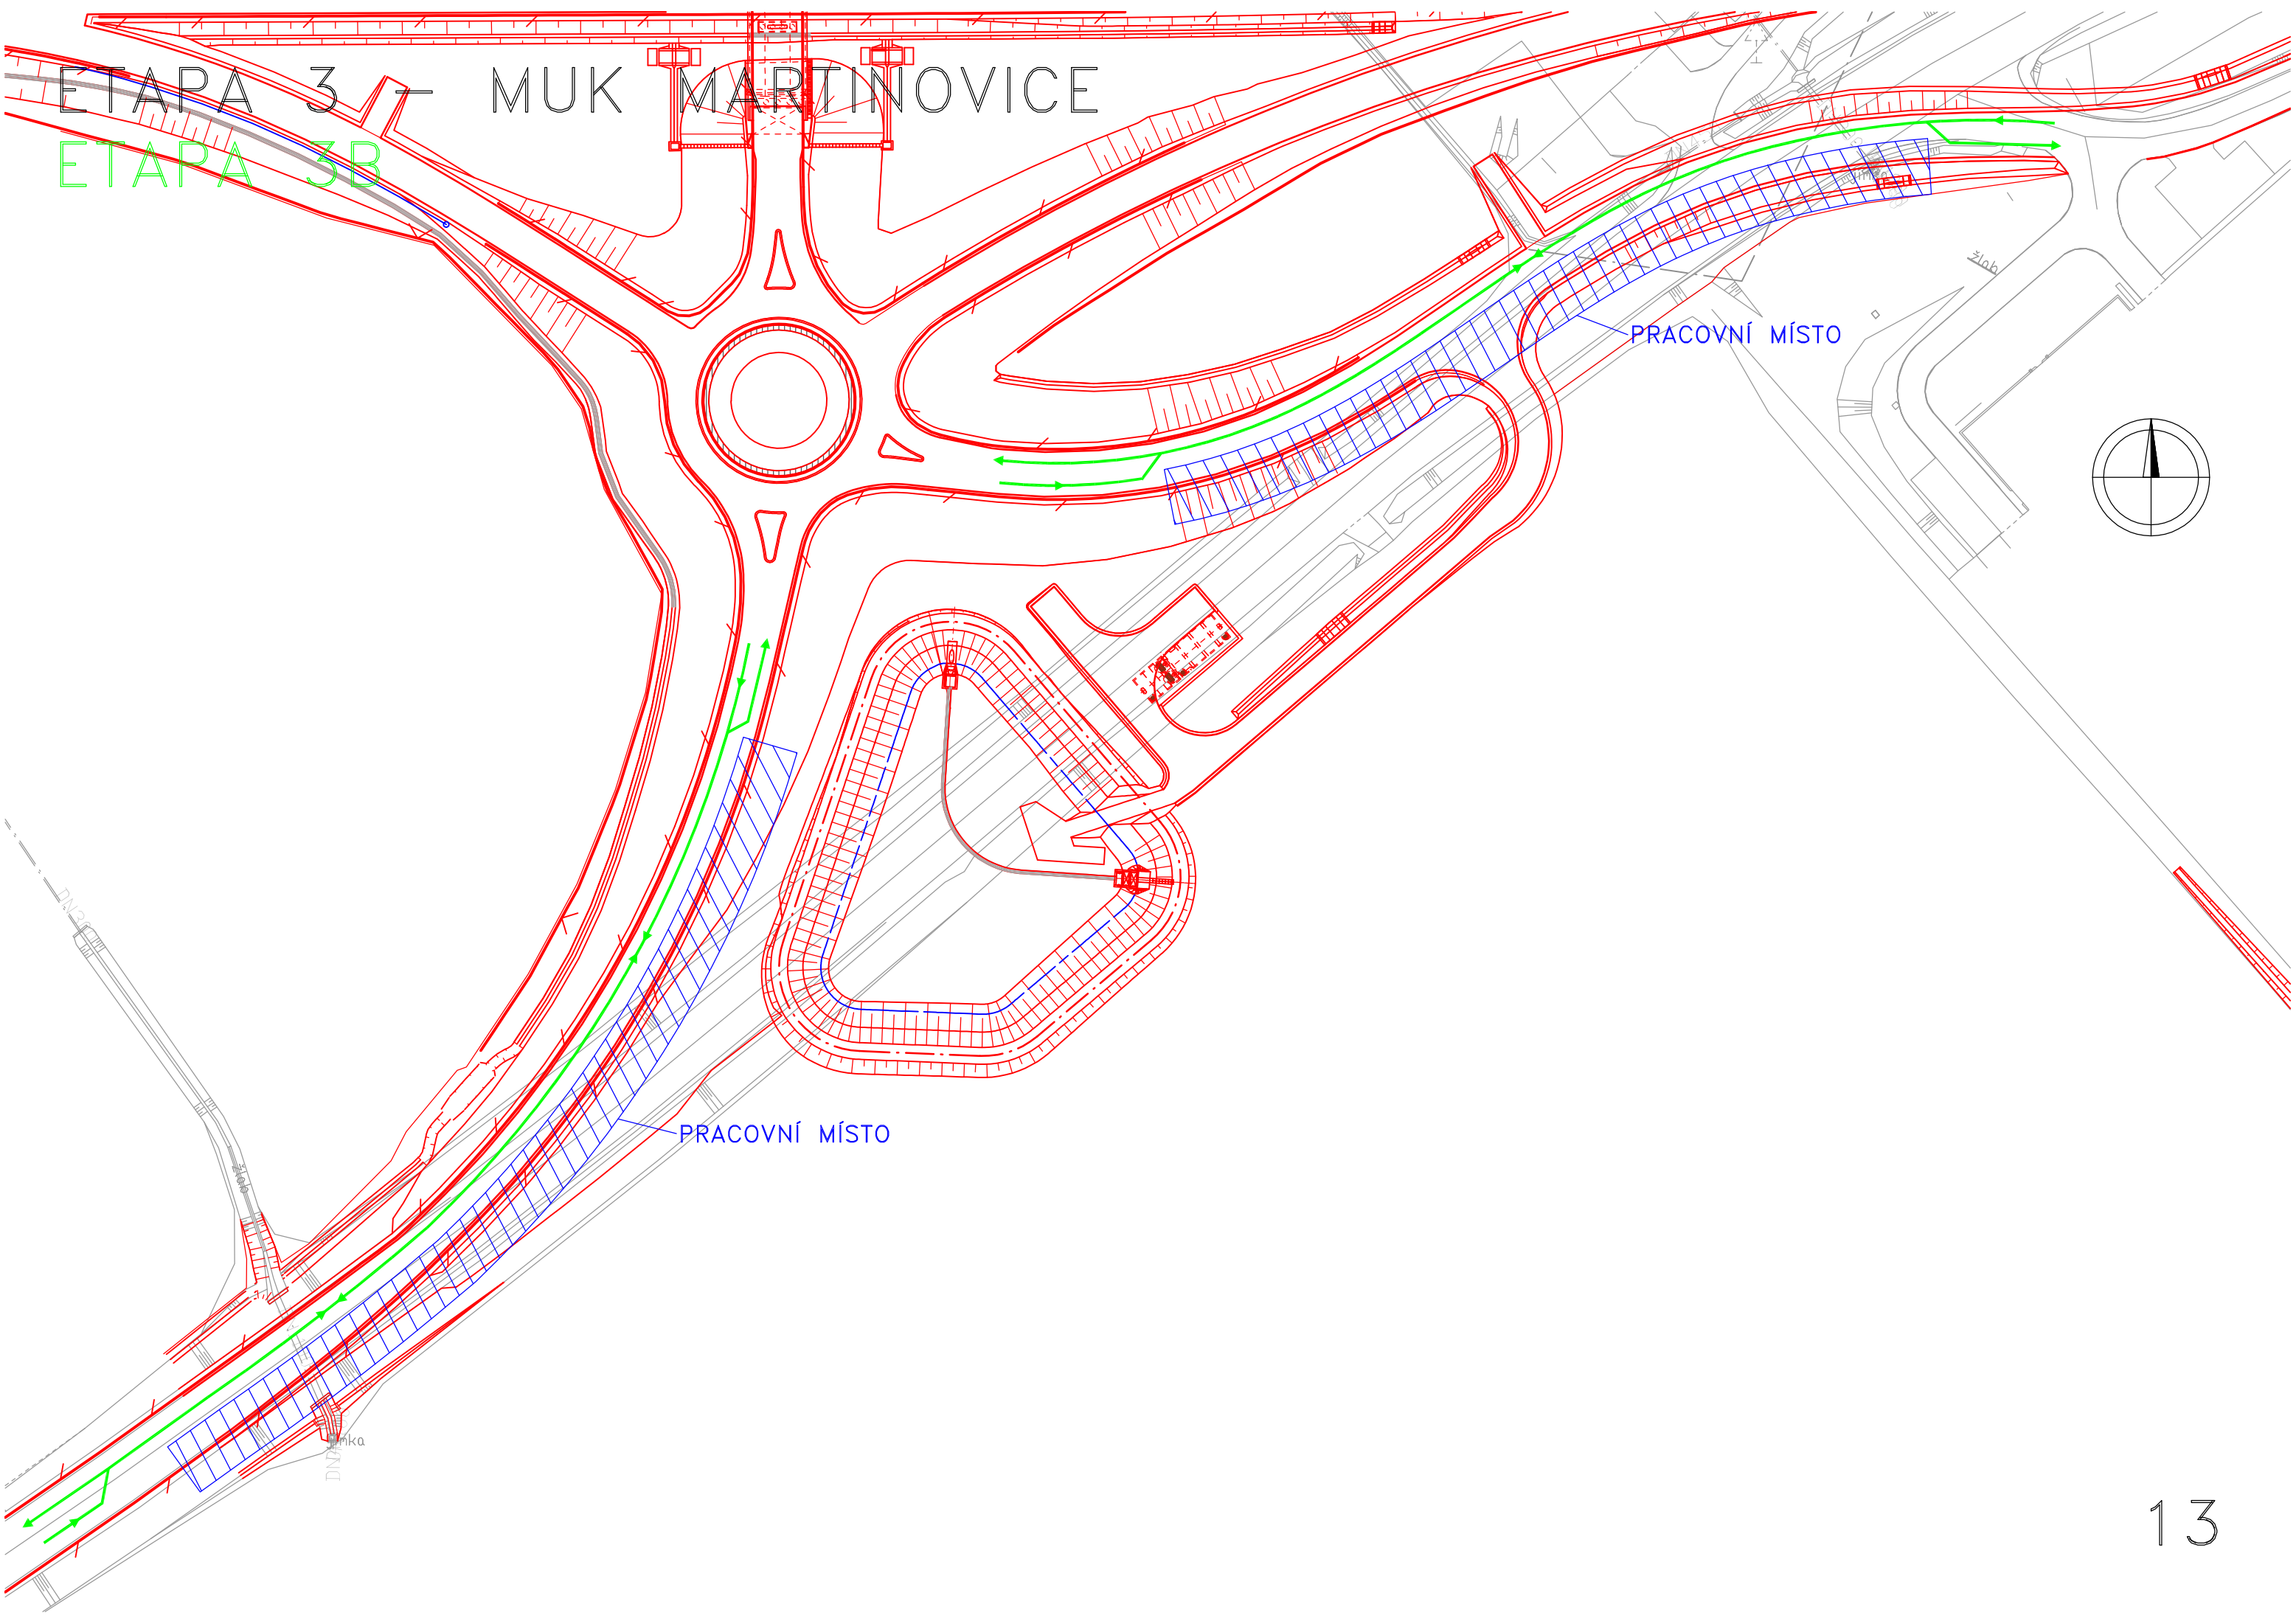


ETAPA 3 – NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ I/16 NA KONCI ÚSEKU

ETAPA 3A

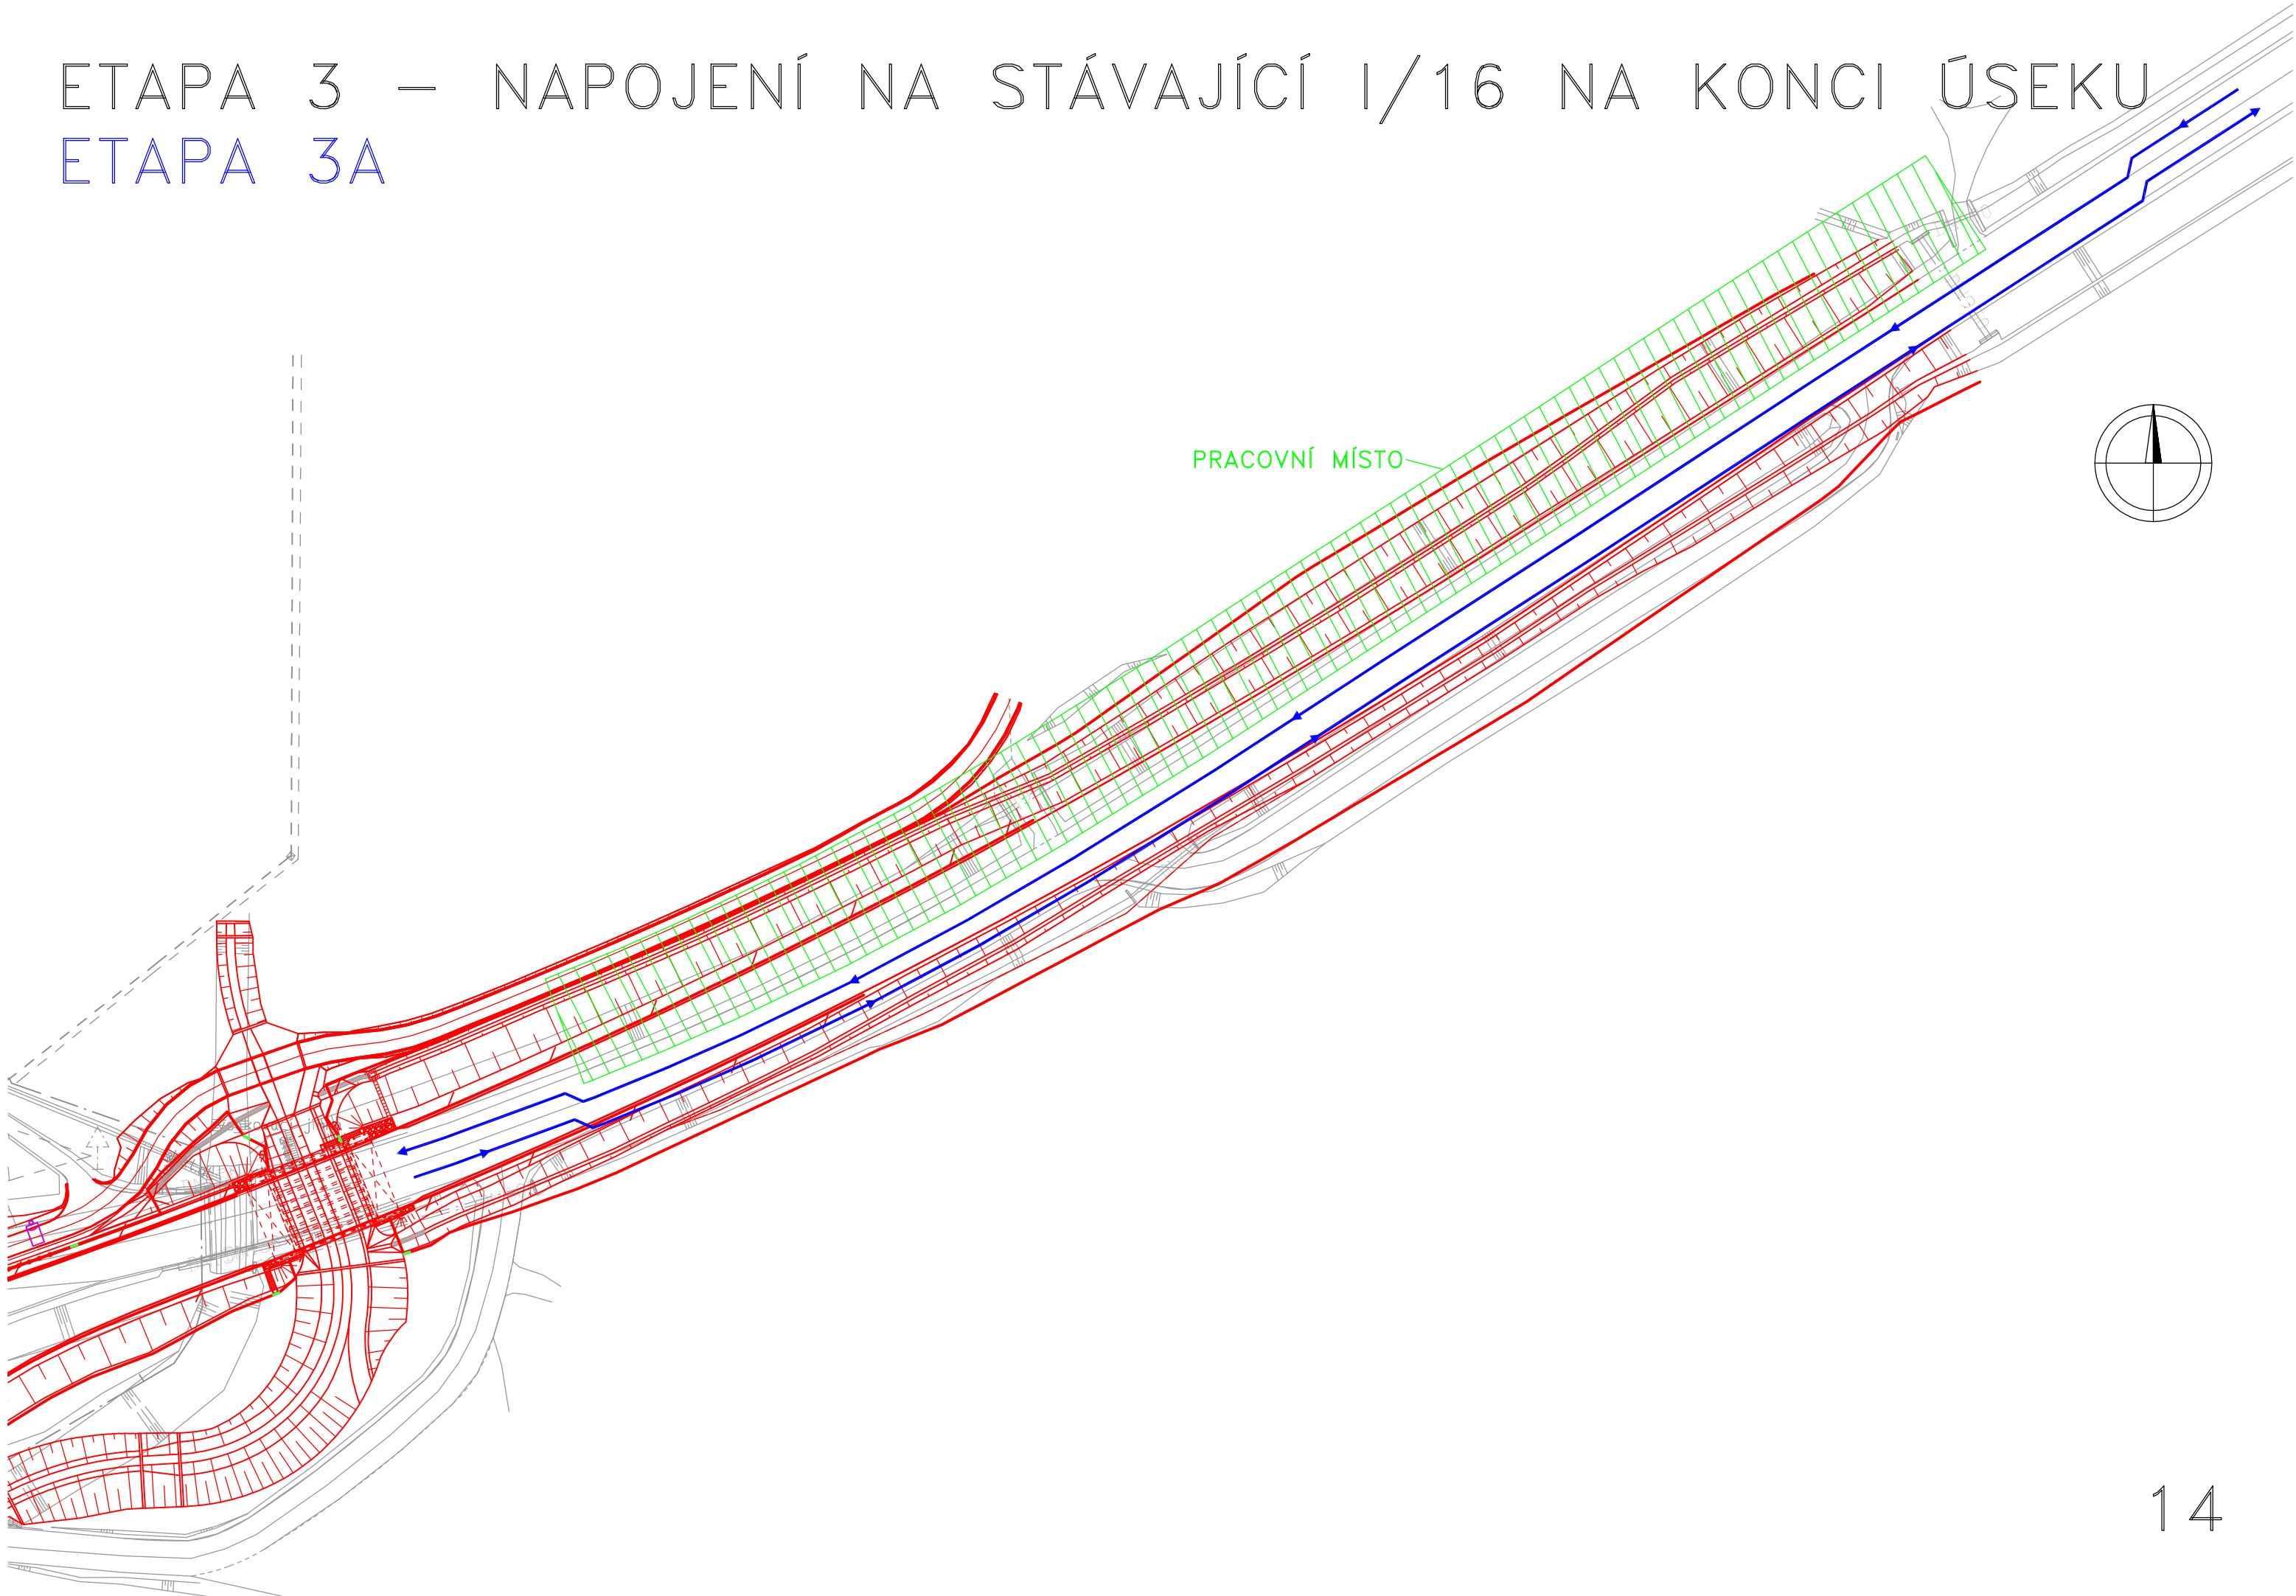


ETAPA 3 – NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ I/16 NA KONCI ÚSEKU

ETAPA 3B

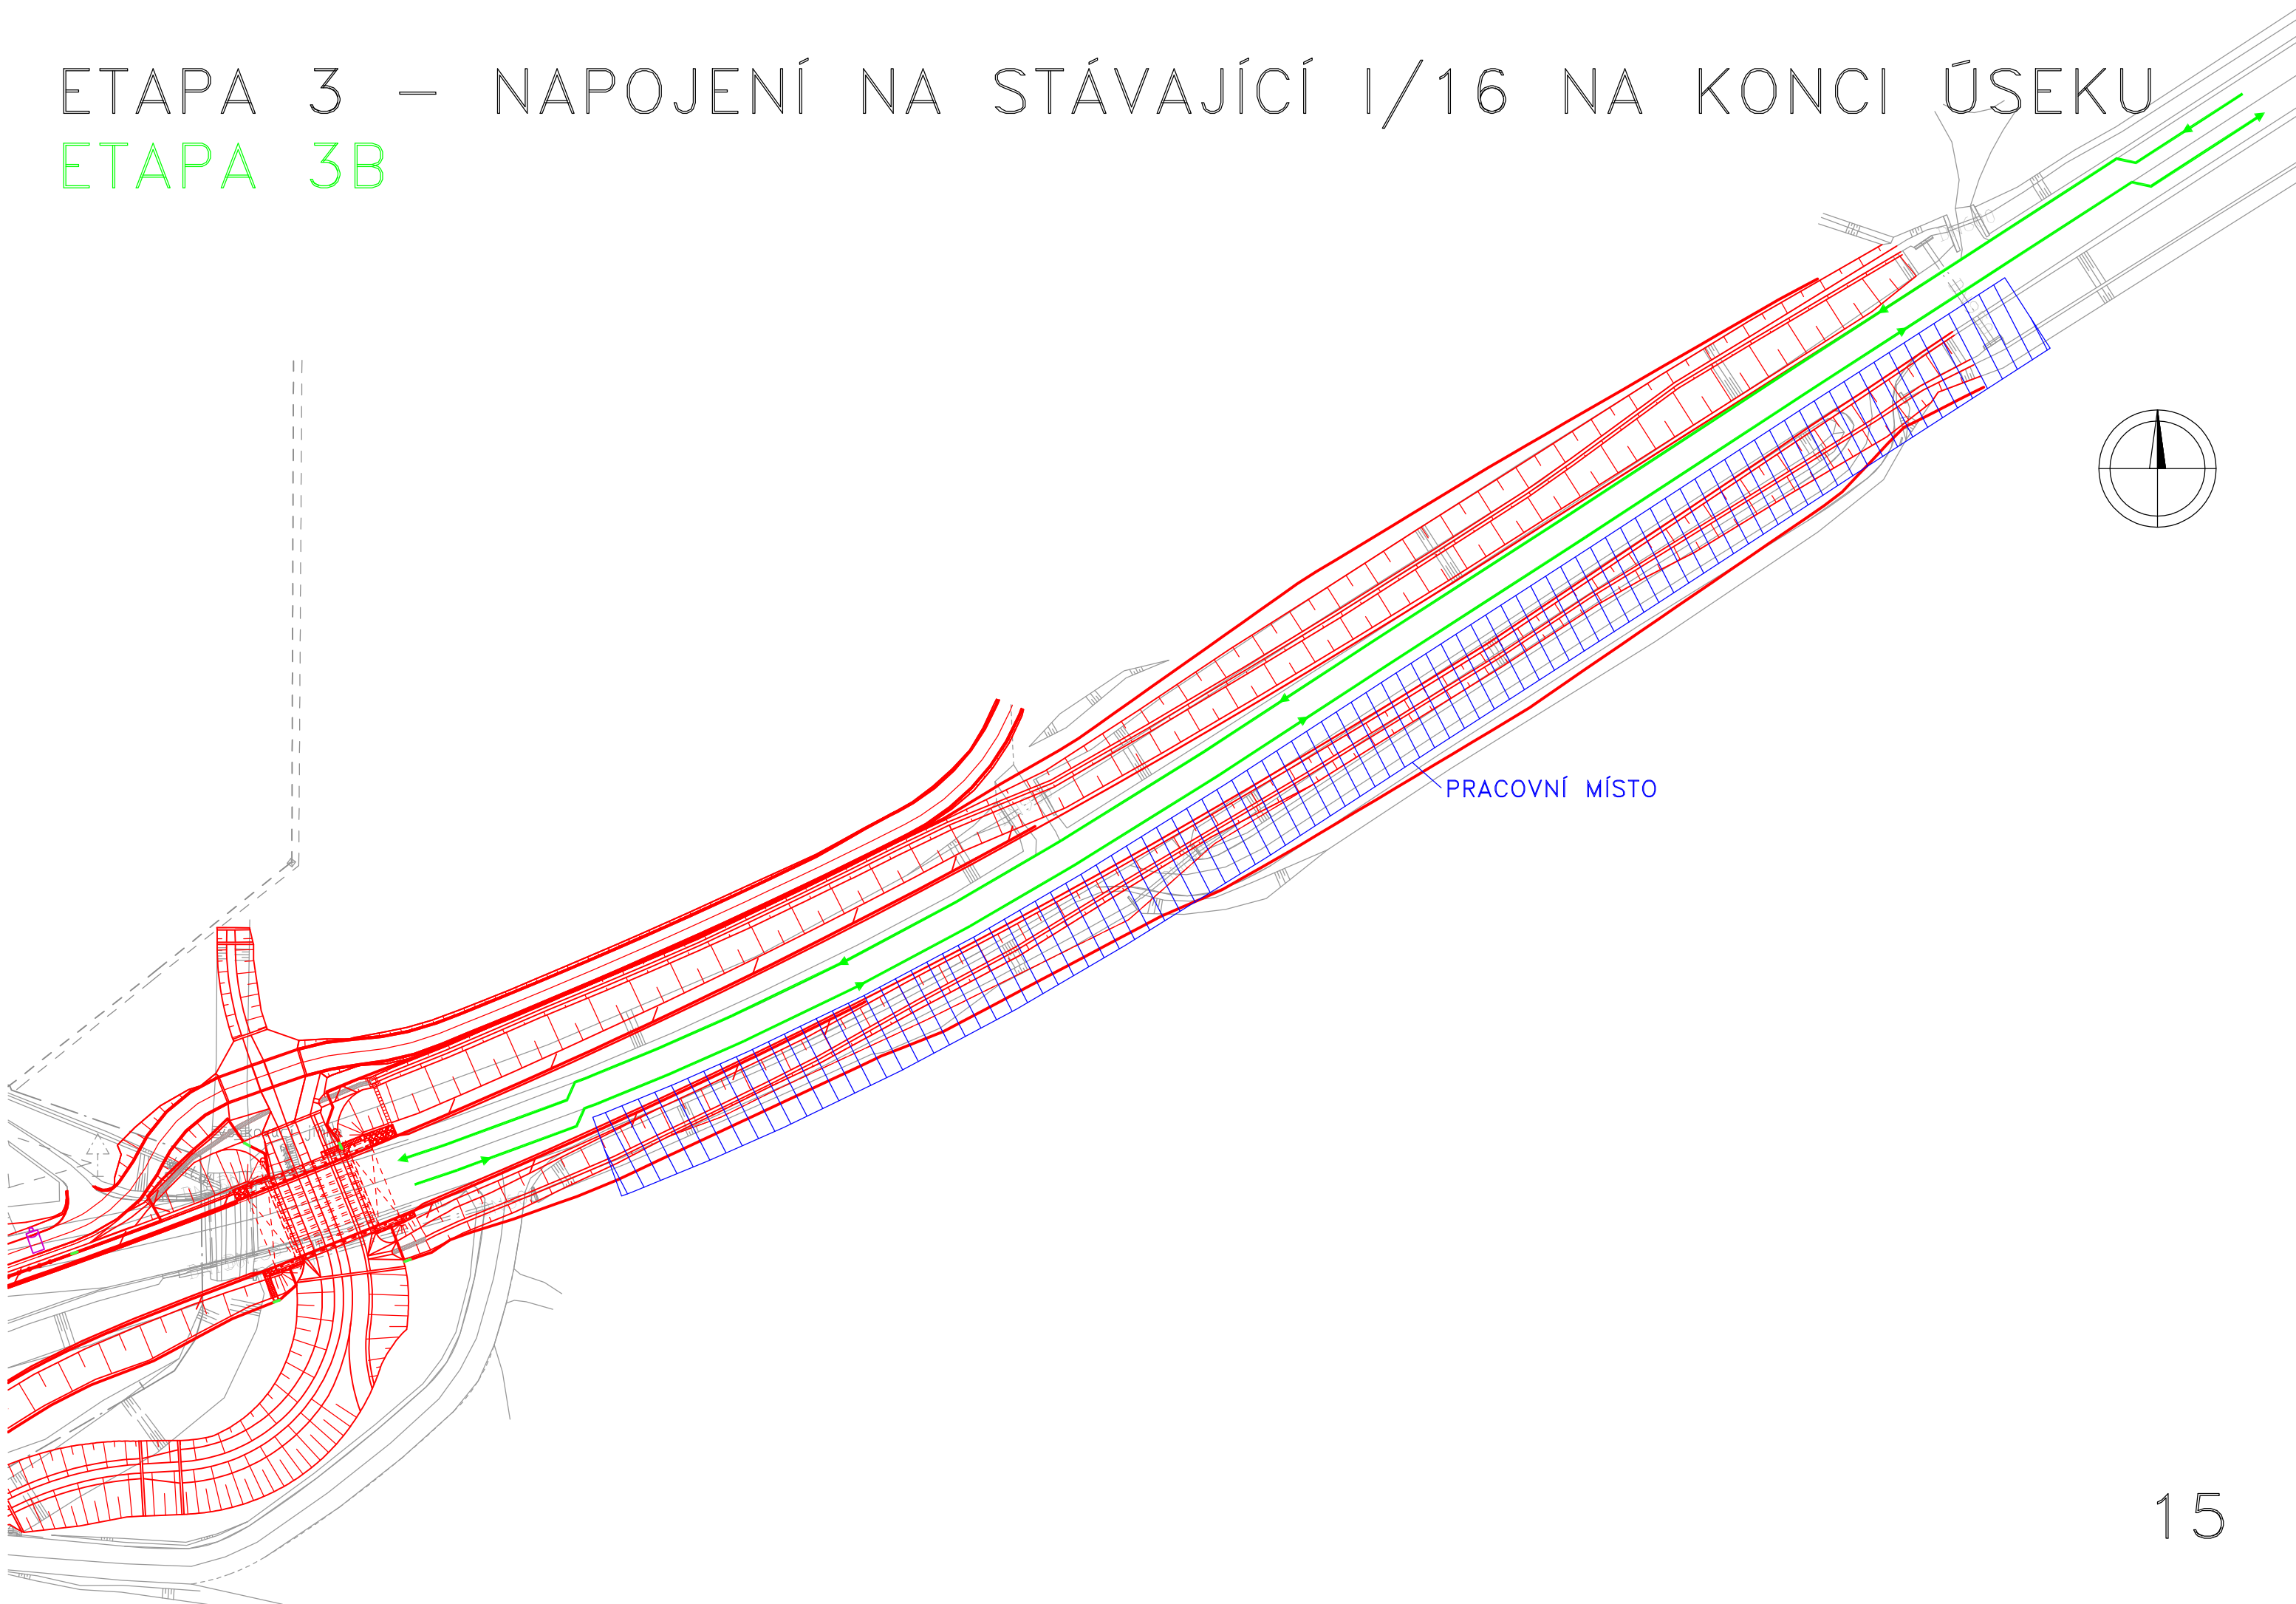

ETAPA 3 – NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ I/16 NA KONCI ÚSEKU

ETAPA 3C1

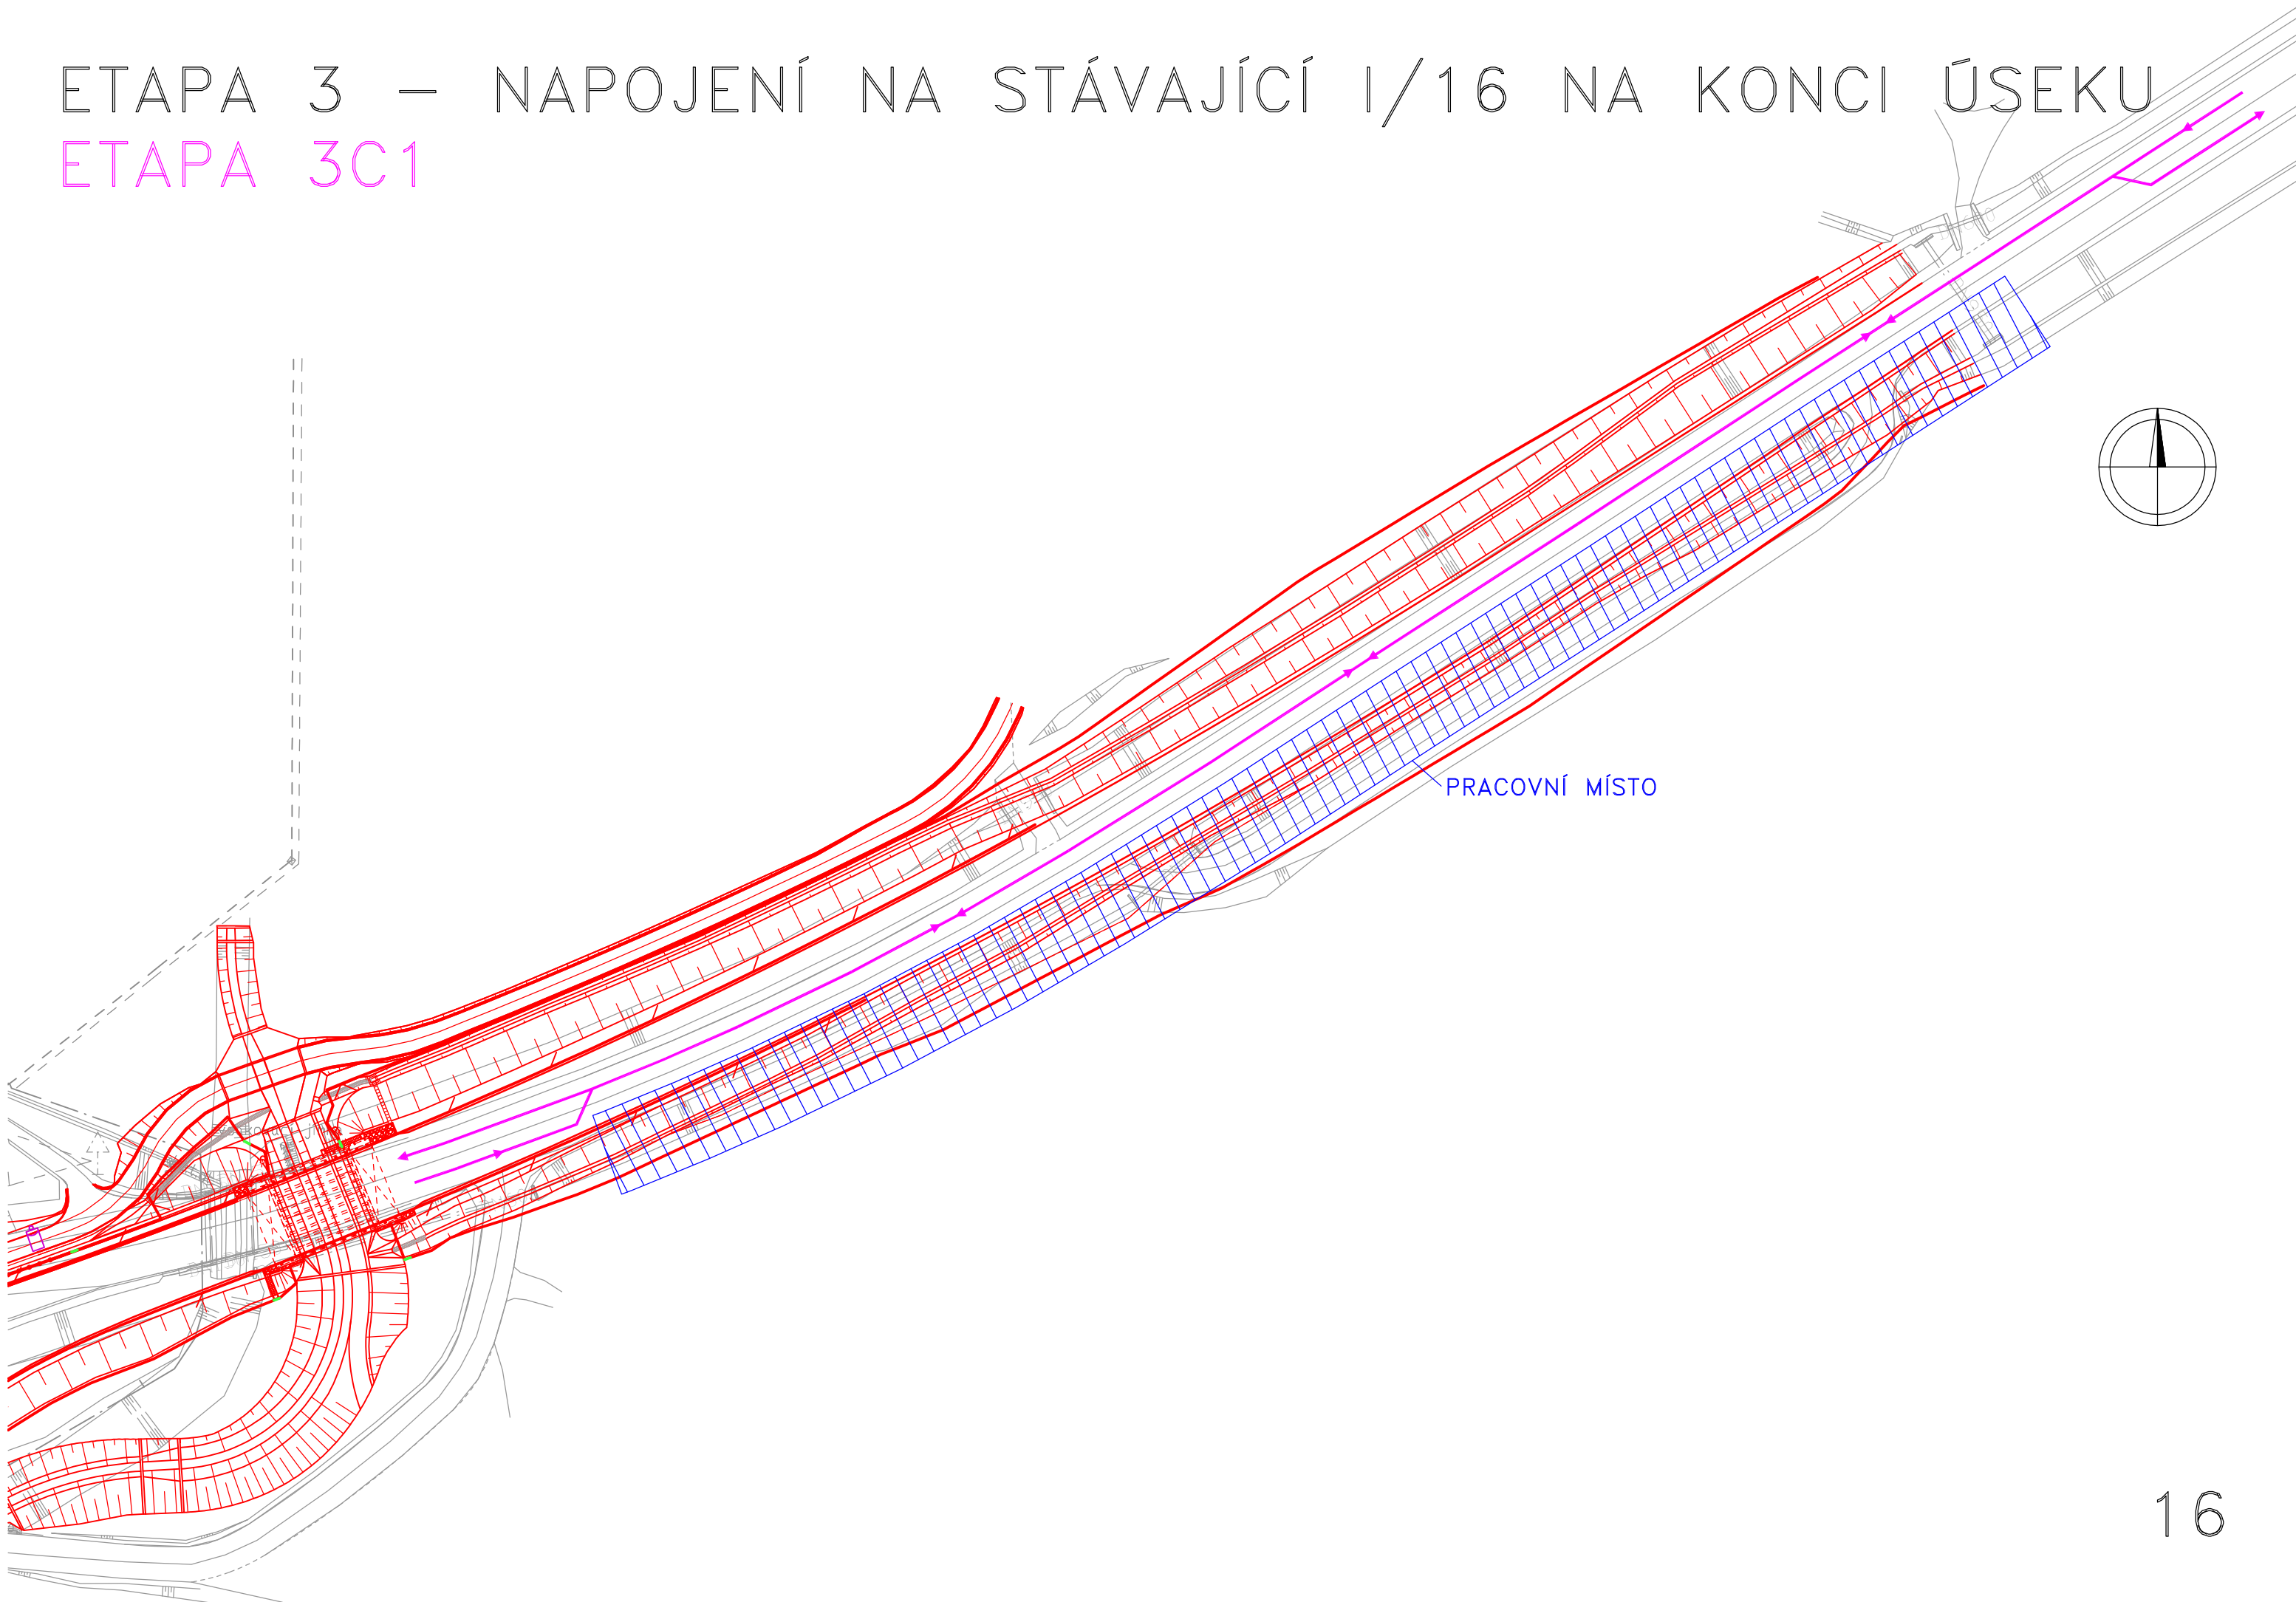

ETAPA 3 – NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ I/16 NA KONCI ÚSEKU

ETAPA 3C2

